DEPARTAMENTO:	**CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**	**CARRERA:**	Ingeniería en Tecnologías de la Información		
ASIGNATURA:	Metodologías de Desarrollo de Software	**NIVEL:**	3	**FECHA:**	14/06/2026
DOCENTE:	Ing. Kevin Chuquitarco, Mgtr.	**PRÁCTICA N°:**	4	**CALIFICACIÓN:**	

Gestión de Proyecto Ágil en Jira Software a partir de los Artefactos Scrum del Sistema NovaMarket

Iker Mathews Guallo Vera, Jeffry David Vera Borja

RESUMEN

En la actualidad, las metodologías ágiles han transformado la manera en que los equipos de desarrollo de software planifican, ejecutan y controlan sus proyectos. Dentro de este contexto, Scrum se consolida como uno de los marcos de trabajo más empleados a nivel mundial, debido a su capacidad para adaptarse a entornos cambiantes y entregar valor de forma incremental. Para gestionar proyectos bajo este marco de trabajo de manera eficiente, las organizaciones recurren a herramientas digitales especializadas, siendo Jira Software de Atlassian una de las más reconocidas y utilizadas en la industria.

Durante esta práctica se configuró un proyecto Scrum en Jira Software tomando como punto de partida los artefactos elaborados en el Laboratorio N°3 para el sistema NovaMarket: las épicas, las historias de usuario y la planificación inicial del Sprint. A partir de estos insumos, se registró el Product Backlog, se asociaron las historias a sus épicas correspondientes, se definió su prioridad y se estimó el esfuerzo en Story Points para cada una de ellas.

Posteriormente, se llevó a cabo la planificación del Sprint 1, seleccionando las historias a desarrollar, asignando responsables y descomponiendo cada historia en subtareas técnicas manejables. El seguimiento del trabajo se realizó a través del Scrum Board, trasladando las tareas entre los estados To Do, In Progress y Done conforme se avanzaba en su ejecución. Para el monitoreo del Sprint se revisaron los reportes de Jira, especialmente el Burndown Chart y el Sprint Report, herramientas clave para analizar el avance real frente al planificado.

Finalmente, la iteración se cerró con la ejecución de una Sprint Review y una Sprint Retrospective, instancias que permitieron evaluar los resultados obtenidos e identificar oportunidades de mejora para futuros ciclos de desarrollo. En términos generales, la práctica evidenció cómo las herramientas de gestión ágil potencian la organización del trabajo en equipo, facilitan la comunicación y permiten tomar decisiones informadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Palabras Clave: *Scrum, Jira Software, Product Backlog, Sprint,*

INTRODUCCIÓN

En el ámbito del desarrollo de software contemporáneo, las metodologías ágiles han adquirido una relevancia significativa como respuesta a las limitaciones que presentan los enfoques tradicionales de gestión de proyectos. Según *Schwaber y Sutherland (2020)*, Scrum es un marco liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos. Este marco organiza el trabajo en ciclos iterativos denominados Sprints, con duración fija entre dos y cuatro semanas, al final de los cuales se entrega un incremento de producto potencialmente desplegable. La adopción de Scrum permite a los equipos inspeccionar y adaptar continuamente tanto el producto como los procesos de trabajo, lo cual es fundamental en entornos donde los requerimientos evolucionan con rapidez y la capacidad de respuesta al cambio representa una ventaja competitiva decisiva para las organizaciones.

La correcta implementación de Scrum requiere no solo comprender sus principios teóricos, sino también contar con herramientas que permitan operacionalizar sus artefactos y ceremonias de manera sistemática. En este sentido, *Sommerville (2018)* señala que el software de gestión de proyectos ágiles facilita la planificación colaborativa, el seguimiento del progreso y la comunicación entre los miembros del equipo, aspectos críticos para el éxito de cualquier iniciativa de desarrollo. Jira Software, desarrollado por Atlassian, es actualmente una de las plataformas más utilizadas a nivel global para este propósito, ya que integra en un solo entorno la gestión del Product Backlog, la planificación de Sprints, el Scrum Board para el seguimiento del flujo de trabajo y un conjunto de reportes analíticos que apoyan la toma de decisiones. Su interfaz intuitiva y su capacidad de personalización la convierten en una herramienta idónea tanto para equipos de desarrollo que recién adoptan Scrum como para organizaciones con procesos ágiles maduros.

Para el desarrollo de esta práctica se retomaron los artefactos Scrum elaborados en el Laboratorio N°3 correspondientes al sistema NovaMarket, una plataforma de comercio electrónico cuyo backlog incluye funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios, el catálogo de productos y el procesamiento de pedidos. De acuerdo con *Atlassian (2024)*, la gestión efectiva de un proyecto en Jira comienza por la correcta configuración de la jerarquía de trabajo, que incluye épicas, historias de usuario y subtareas, elementos que deben reflejar fielmente los requerimientos del cliente y estar priorizados según el valor que aportan al negocio. En este contexto, la práctica buscó simular un flujo de trabajo ágil completo, desde la creación del proyecto y la carga del Product Backlog hasta el cierre formal del Sprint, con el fin de desarrollar competencias prácticas aplicables en entornos profesionales reales de desarrollo de software.

OBJETIVOS

Objetivo General

Gestionar un proyecto de desarrollo de software ágil utilizando Jira Software como herramienta de soporte al marco de trabajo Scrum, mediante la configuración del Product Backlog, la

planificación y ejecución de un Sprint y el análisis de reportes de avance, a partir de los artefactos del sistema NovaMarket elaborados en el Laboratorio N°3.

Objetivos Específicos

- Configurar un proyecto Scrum en Jira Software registrando épicas e historias de usuario del sistema NovaMarket en el Product Backlog, con su prioridad y estimación definidas.
- Planificar y ejecutar el Sprint 1 del proyecto NovaMarket mediante la asignación de responsables, la estimación en Story Points y la creación de subtareas técnicas en Jira Software.
- Analizar el progreso del Sprint a través de los reportes de Jira (Burndown Chart y Sprint Report) para evaluar el cumplimiento de lo planificado y extraer conclusiones sobre la gestión ágil del proyecto.

MARCO TEÓRICO

Scrum es un marco de trabajo ágil diseñado para gestionar proyectos complejos mediante ciclos iterativos de entrega denominados Sprints. Según *Schwaber y Sutherland (2020)*, Scrum se fundamenta en tres pilares empíricos: transparencia, inspección y adaptación. Estos principios garantizan que el proceso sea visible para todos los involucrados, que el avance se evalúe con regularidad y que el equipo ajuste su plan de trabajo en función de lo aprendido en cada iteración. En Scrum participan tres roles principales: el Product Owner, responsable de maximizar el valor del producto gestionando el Product Backlog; el Scrum Master, encargado de facilitar la adopción del marco y remover impedimentos; y el equipo de desarrollo, que ejecuta el trabajo técnico necesario para entregar el incremento de producto al finalizar cada Sprint.

El Product Backlog constituye el artefacto central de Scrum, pues contiene la lista ordenada de todo lo que se requiere en el producto, expresada habitualmente en forma de épicas e historias de usuario. Las épicas representan bloques grandes de funcionalidad que se subdividen en historias más pequeñas, mientras que las historias de usuario describen necesidades concretas desde la perspectiva del usuario final utilizando el formato: "Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]". El Sprint Backlog, por su parte, es el subconjunto del Product Backlog seleccionado para trabajar durante un Sprint específico, complementado con el plan detallado de cómo el equipo entregará el incremento. Tal como afirma *Sommerville (2018)*, la descomposición de las historias en subtareas técnicas permite distribuir el trabajo de forma equitativa y hacer un seguimiento más preciso del avance durante la iteración.

Tabla 1. Conceptos clave de Scrum utilizados en la práctica

Concepto	Definición
Épica	Bloque grande de funcionalidad que agrupa múltiples historias de usuario relacionadas.
Historia de usuario	Descripción de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario, con criterios de aceptación definidos.

Sprint Backlog	Conjunto de historias de usuario seleccionadas para desarrollar durante un Sprint, con sus subtareas.
Story Points	Unidad de medida relativa utilizada para estimar el esfuerzo necesario para completar una historia.
Scrum Board	Tablero visual con columnas To Do, In Progress y Done para gestionar el flujo de trabajo del Sprint.
Burndown Chart	Gráfico que muestra el trabajo pendiente vs. el tiempo transcurrido dentro del Sprint.
Sprint Review	Ceremonia de cierre del Sprint donde el equipo presenta el incremento desarrollado a los interesados.
Sprint Retrospective	Ceremonia de mejora continua donde el equipo analiza su proceso y propone acciones de mejora.

Nota: Elaborado a partir de Schwaber y Sutherland (2020) y Atlassian (2024).


Jira Software es la plataforma de gestión ágil de proyectos desarrollada por Atlassian, líder en el mercado de herramientas de colaboración para equipos de software. De acuerdo con *Atlassian (2024)*, Jira permite configurar proyectos bajo plantillas Scrum o Kanban, gestionar el Product Backlog mediante listas priorizadas de épicas e historias, planificar Sprints, asignar tareas, estimar esfuerzo y monitorear el avance mediante un conjunto completo de reportes analíticos. El Burndown Chart es uno de los reportes más relevantes, ya que compara la velocidad ideal de consumo del trabajo planificado con la velocidad real del equipo, permitiendo detectar desviaciones de manera temprana. El Sprint Report complementa esta visión al detallar qué historias fueron completadas, cuáles quedaron pendientes y qué cambios se realizaron durante la iteración, información fundamental para la Sprint Review y la Retrospective.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Para desarrollar esta práctica se utilizó una computadora con acceso a internet y navegador web, desde donde se accedió a Jira Software. Como base de trabajo se emplearon los artefactos Scrum elaborados en el Laboratorio N°3 del sistema NovaMarket. El procedimiento se organizó en seis bloques de actividades descritos a continuación.


1. Creación de la Cuenta y del Proyecto Scrum

Paso 1.1 — Ingreso a Jira Software

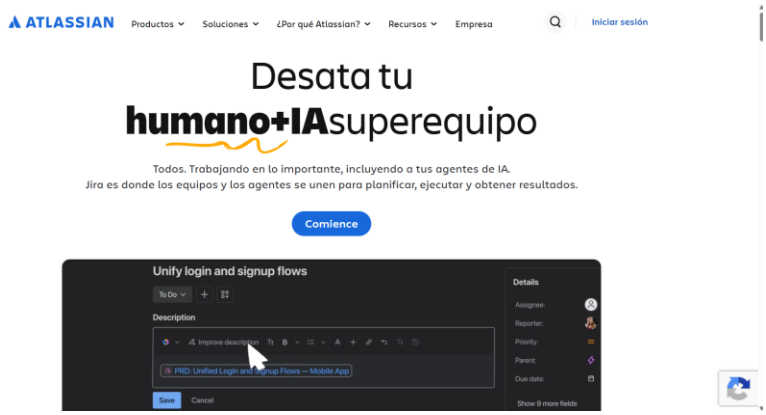


Descripción: Se muestra la página de acceso a la plataforma Jira Software, punto de partida para el registro de la cuenta.

Paso 1.2 — Selección de la opción Sign Up

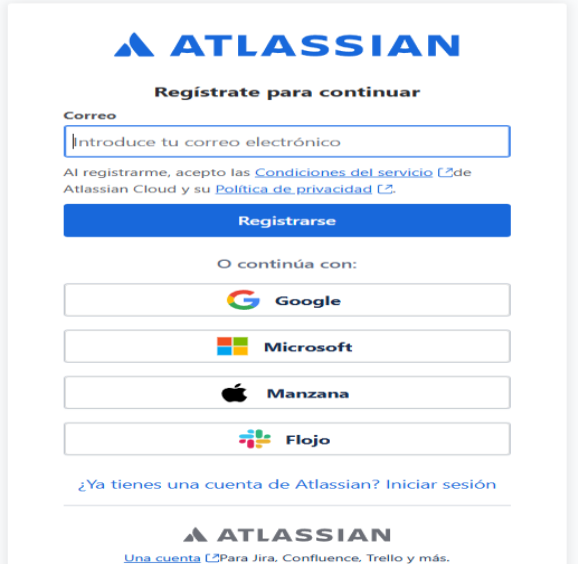

Descripción: Se evidencia la selección de la opción "Sign Up" para iniciar el proceso de registro de una nueva cuenta en Jira.

Paso 1.3 — Registro de la cuenta con correo electrónico

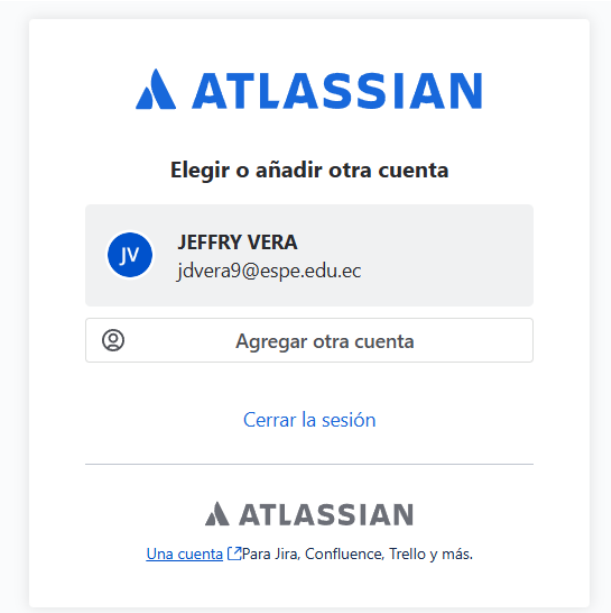


Descripción: Se muestra el formulario de registro completado con el correo electrónico utilizado para crear la cuenta de Jira.

Paso 1.4 — Verificación de la cuenta




Descripción: Se evidencia el correo de verificación recibido y el enlace utilizado para activar la cuenta creada.

Paso 1.5 — Inicio de sesión en Jira

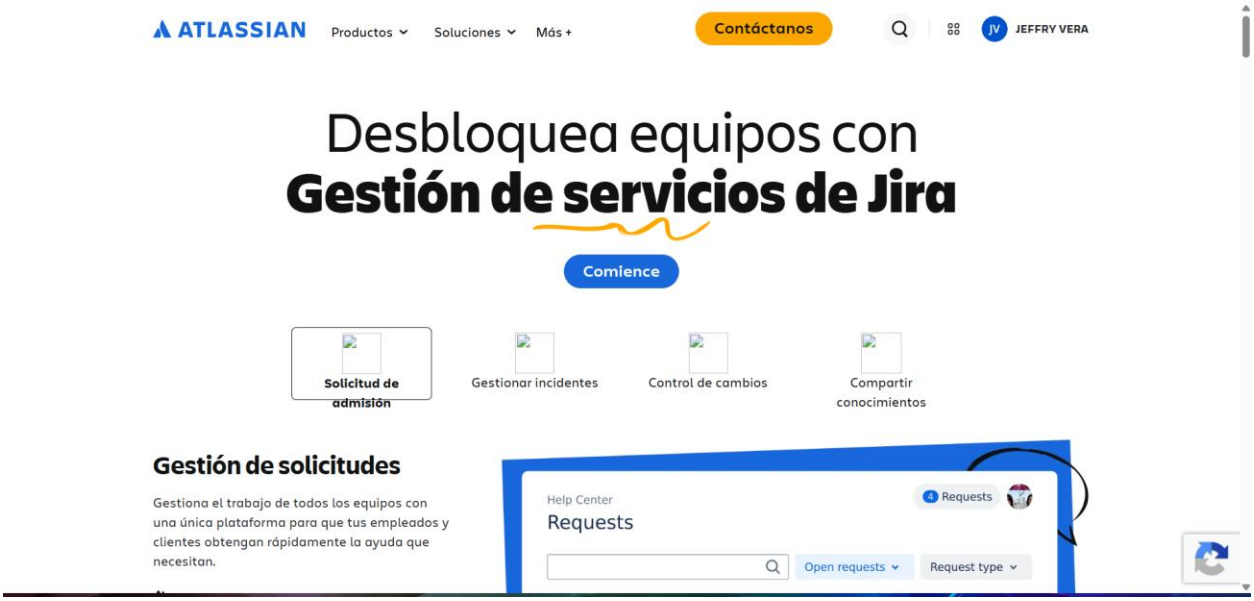


Descripción: Se muestra el ingreso exitoso a la plataforma Jira con la cuenta previamente verificada.

Paso 1.6 — Selección de la opción Projects

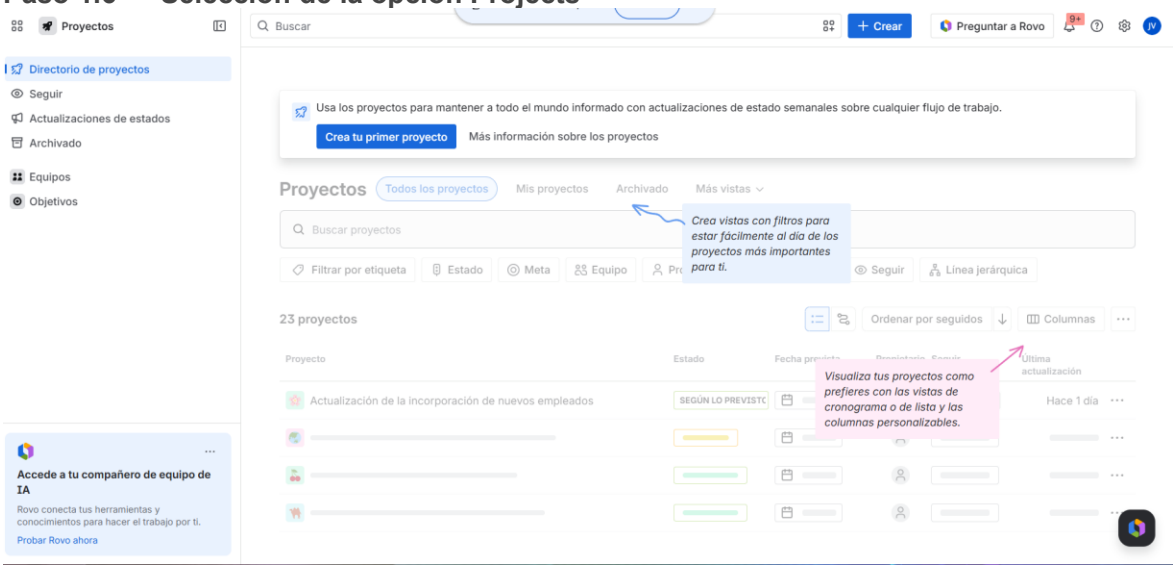


Descripción: Se evidencia el acceso al menú "Projects" desde el panel principal de Jira.

Paso 1.7 — Clic en Create Project

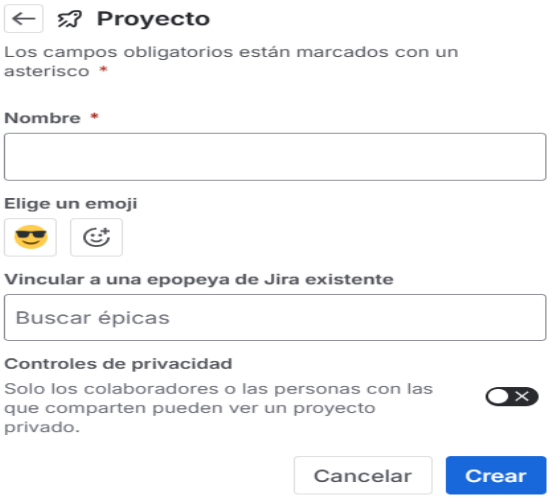


Descripción: Se muestra la opción "Create Project" seleccionada para iniciar la configuración de un nuevo proyecto.

Paso 1.8 — Selección de Software Development y plantilla Scrum

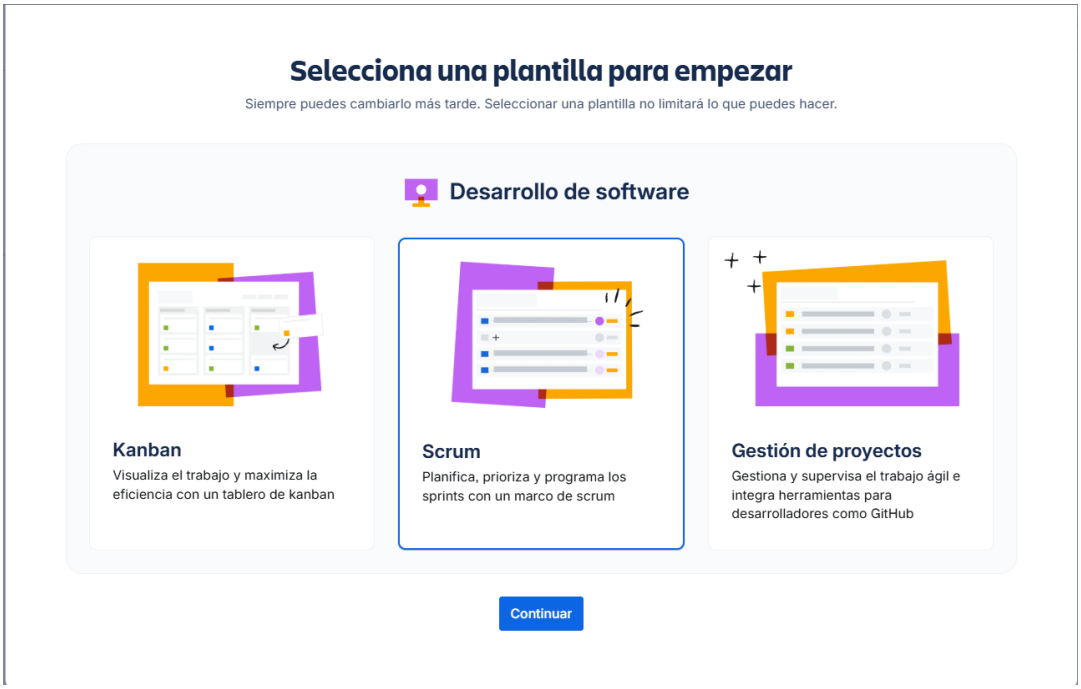


Descripción: Se evidencia la selección de la categoría "Software Development" y la plantilla "Scrum" como tipo de proyecto.

Paso 1.9 — Uso de la plantilla (Use Template)

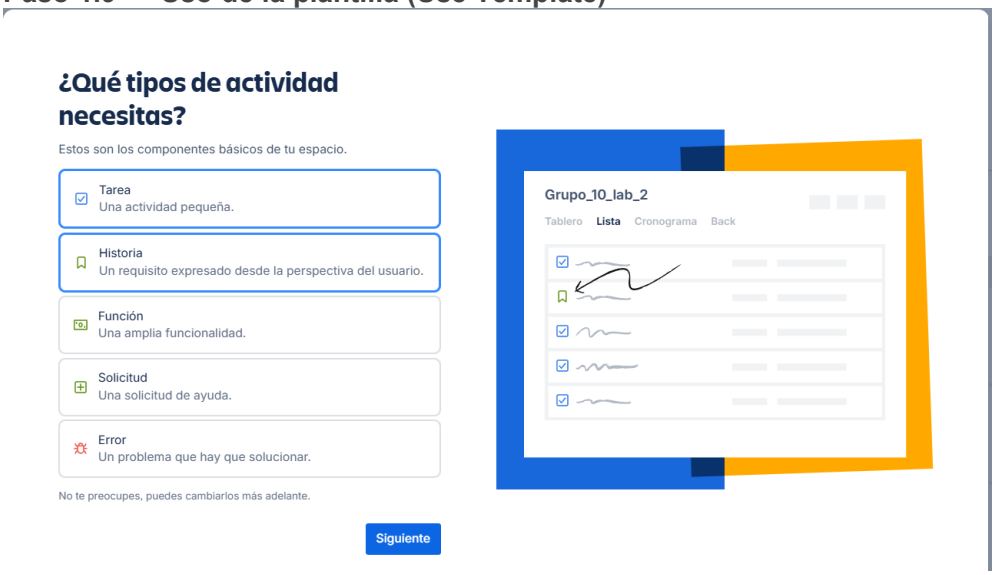

Descripción: Se muestra la confirmación del uso de la plantilla Scrum seleccionada para el nuevo proyecto.

Paso 1.10 — Configuración del nombre del proyecto (NovaMarket)

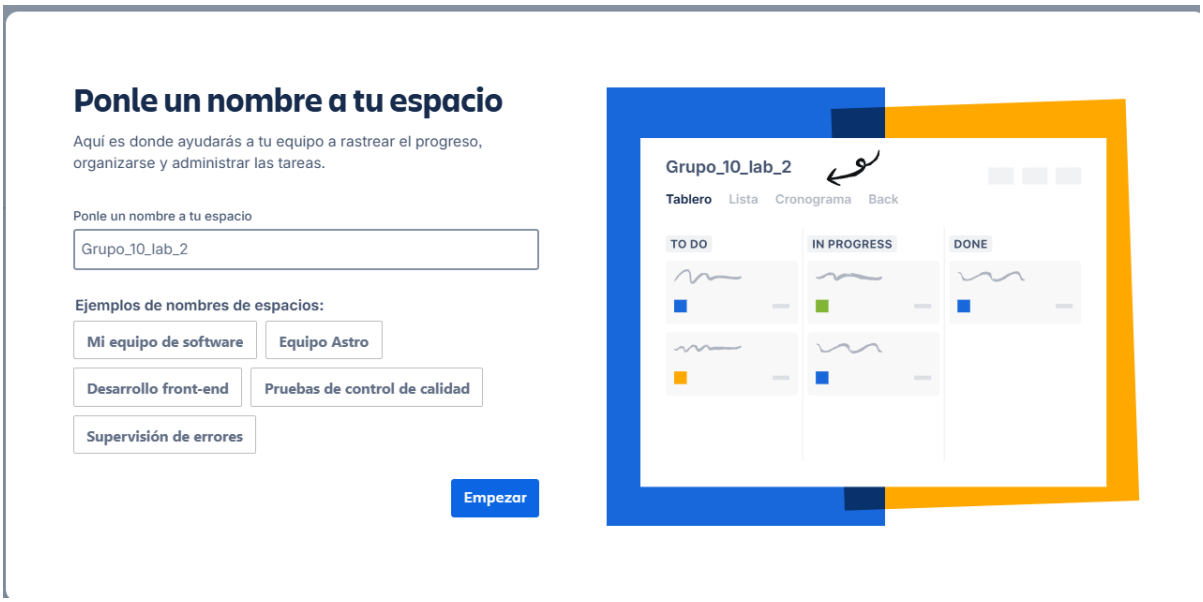


Descripción: Se evidencia el ingreso del nombre del proyecto”Grupo*10_lab_2*" en el formulario de configuración.

Paso 1.11 — Verificación de la clave (Key) del proyecto




Descripción: Se muestra la clave (Key) generada automáticamente por Jira para identificar el proyecto.

Paso 1.12 — Creación del proyecto (Create Project)

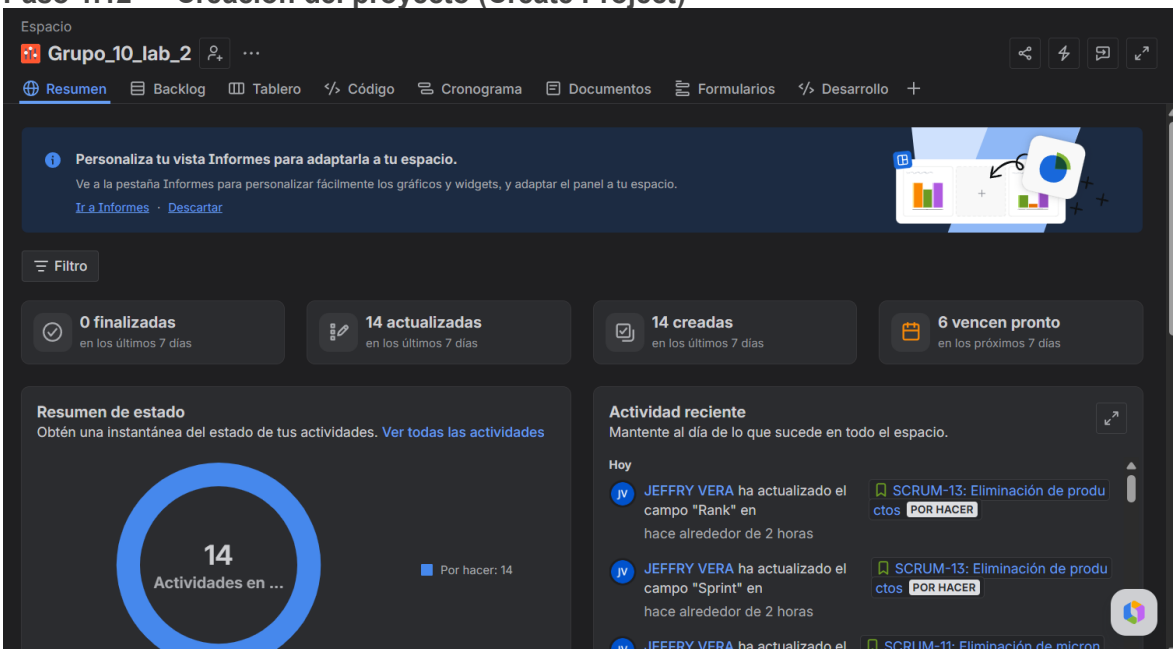

Descripción: Se evidencia la creación exitosa del proyecto dentro de Jira Software.


Paso 1.13 — Exploración de la estructura del proyecto

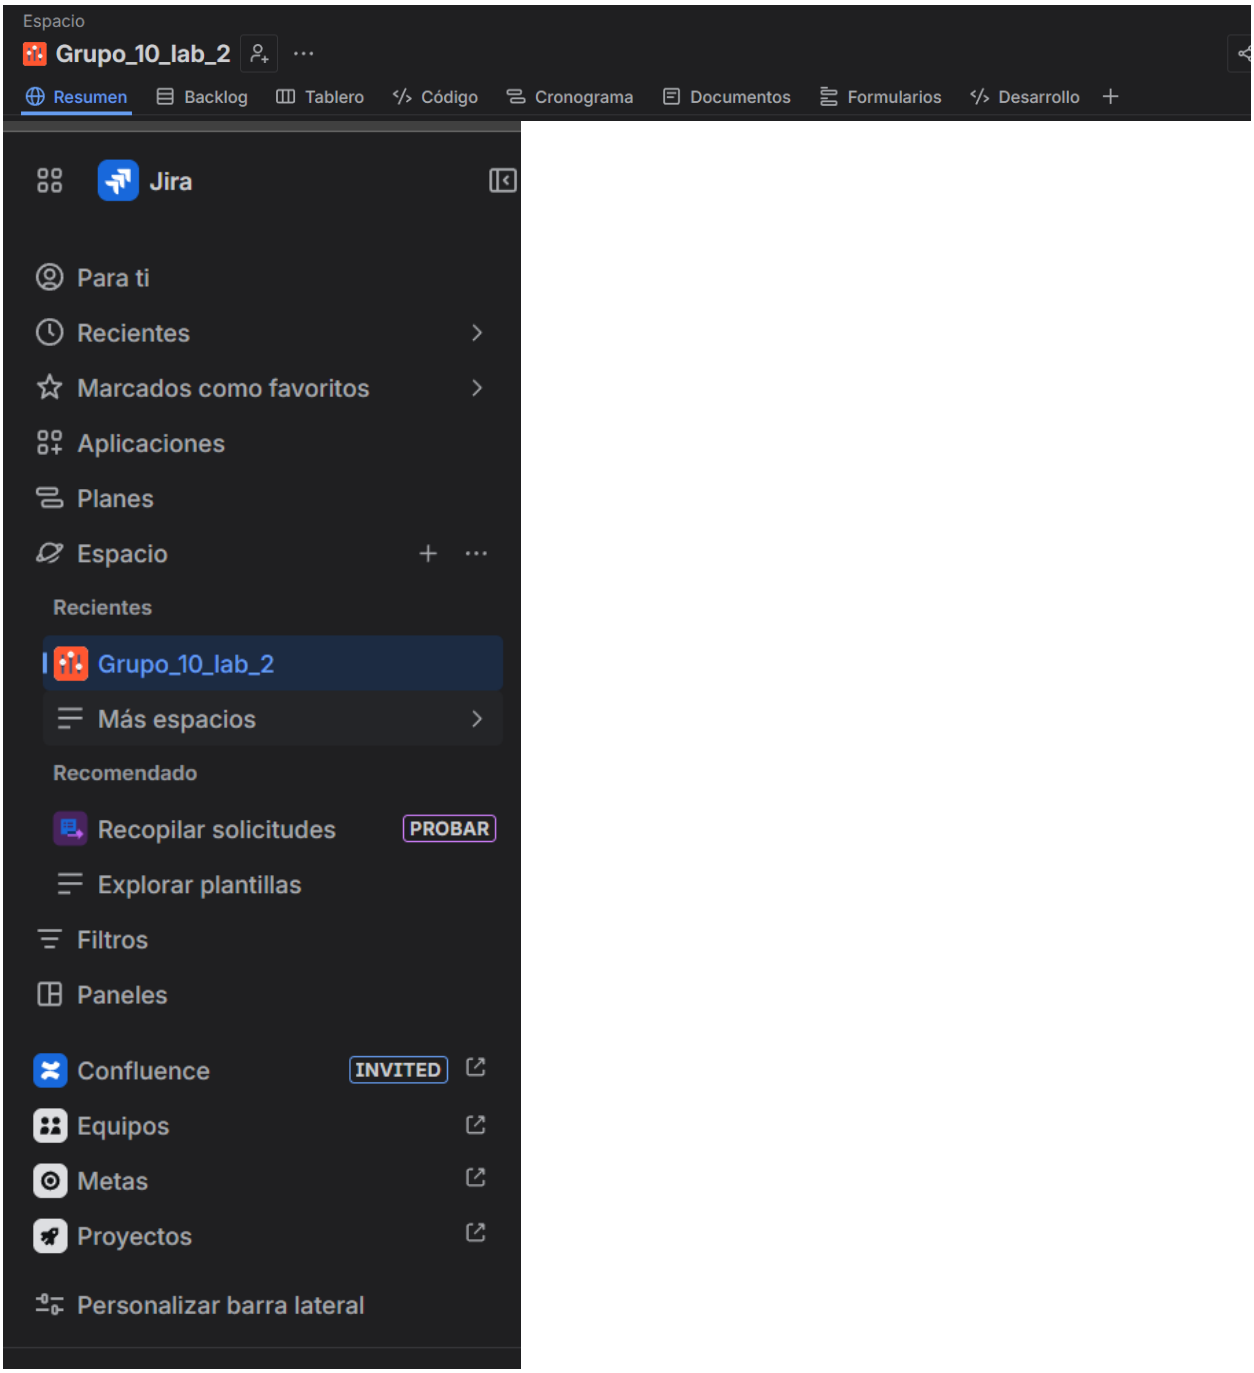

Descripción: Se muestra el menú lateral del proyecto con las secciones Summary, Backlog, Board, Reports e Issues identificadas.


2. Creación de Épicas y Configuración del Product Backlog

Paso 2.1 — Acceso al Backlog del proyecto

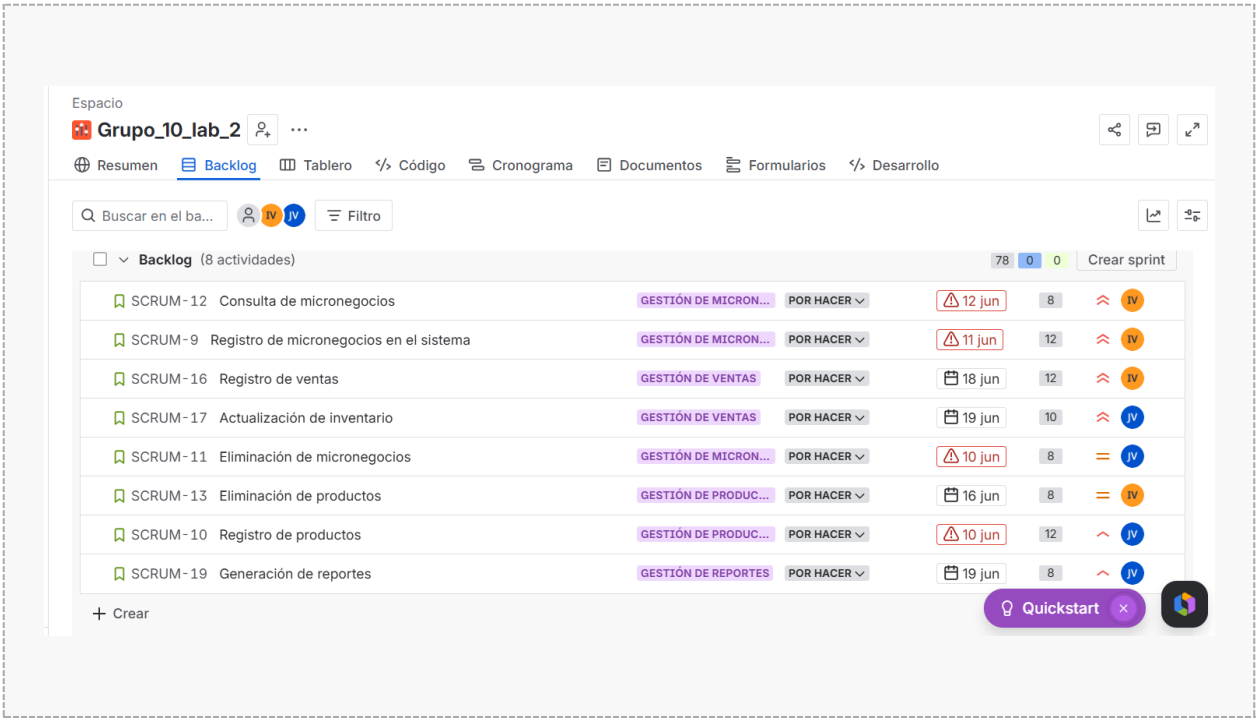

Descripción: Se evidencia el ingreso a la sección "Backlog" del proyecto NovaMarket.

Paso 2.2 — Localización del panel Epics y creación de la primera épica

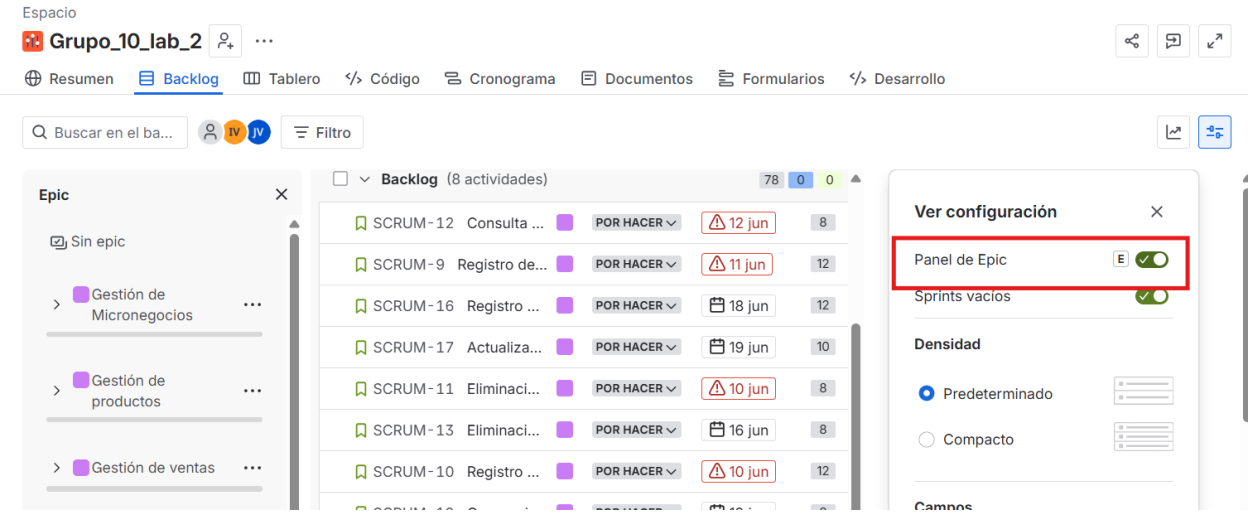


Descripción: Se muestra el panel "Epics" y el formulario "Create Epic" con el nombre y descripción de la primera épica registrados.

Paso 2.3 — Creación de las épicas restantes



Descripción: Se evidencia el registro de las demás épicas definidas en el Laboratorio N°3 para el proyecto NovaMarket.

Paso 2.4 — Verificación de las épicas creadas

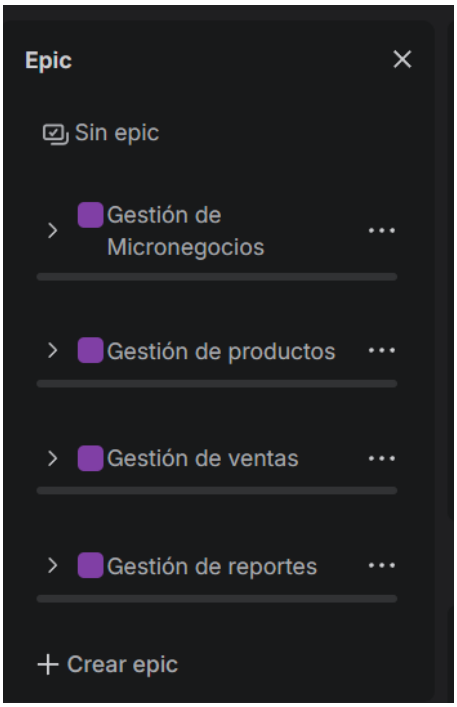


Descripción: Se muestra el panel de Epics con todas las épicas registradas, verificando nombres descriptivos y ausencia de duplicados.

Paso 2.5 — Creación de historias de usuario (Create Issue → Story)




Descripción: Se evidencia la creación de una historia de usuario seleccionando el tipo "Story" e ingresando título y descripción.

Paso 2.6 — Registro de las historias de usuario restantes

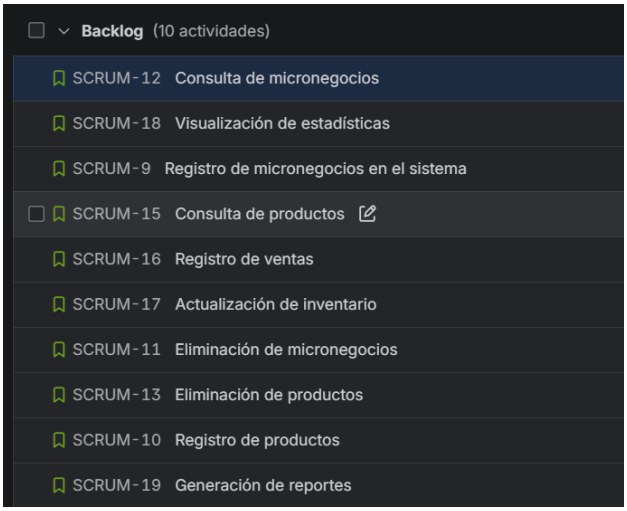


Descripción: Se muestra el listado de historias de usuario del proyecto registradas en el Backlog.

Paso 2.7 — Asociación de historias de usuario a sus épicas

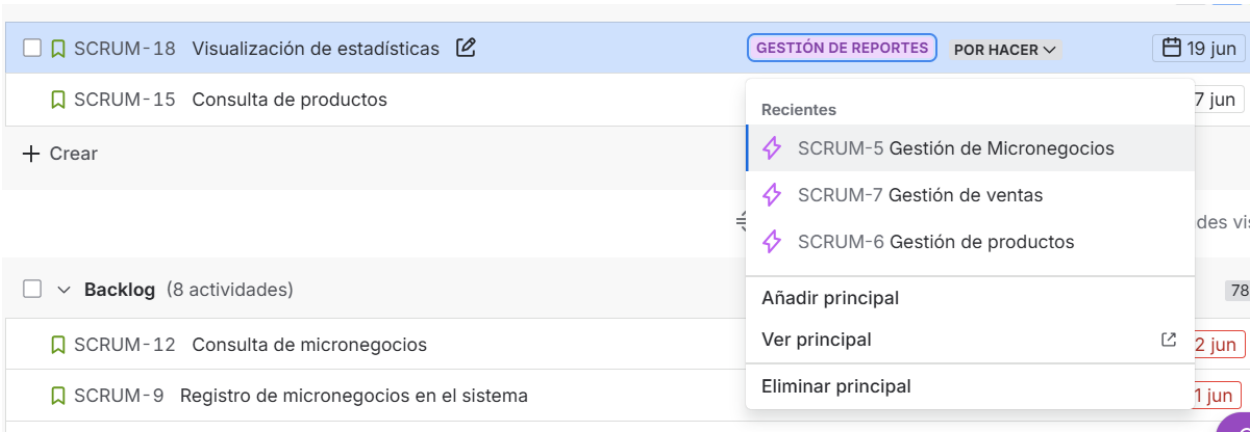


Descripción: Se evidencia el campo "Epic" de una historia de usuario configurado con la épica correspondiente.


Paso 2.8 — Configuración de la prioridad de las historias

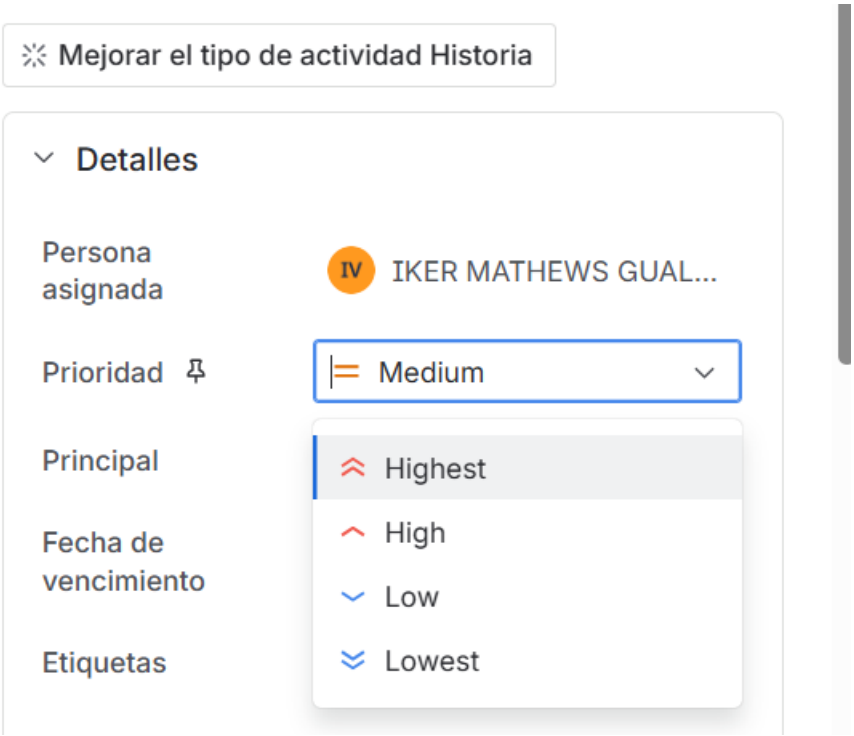

Descripción: Se muestra el campo "Priority" asignado (Highest, High, Medium, Low o Lowest) en una de las historias de usuario.


Paso 2.9 — Información detallada de las historias

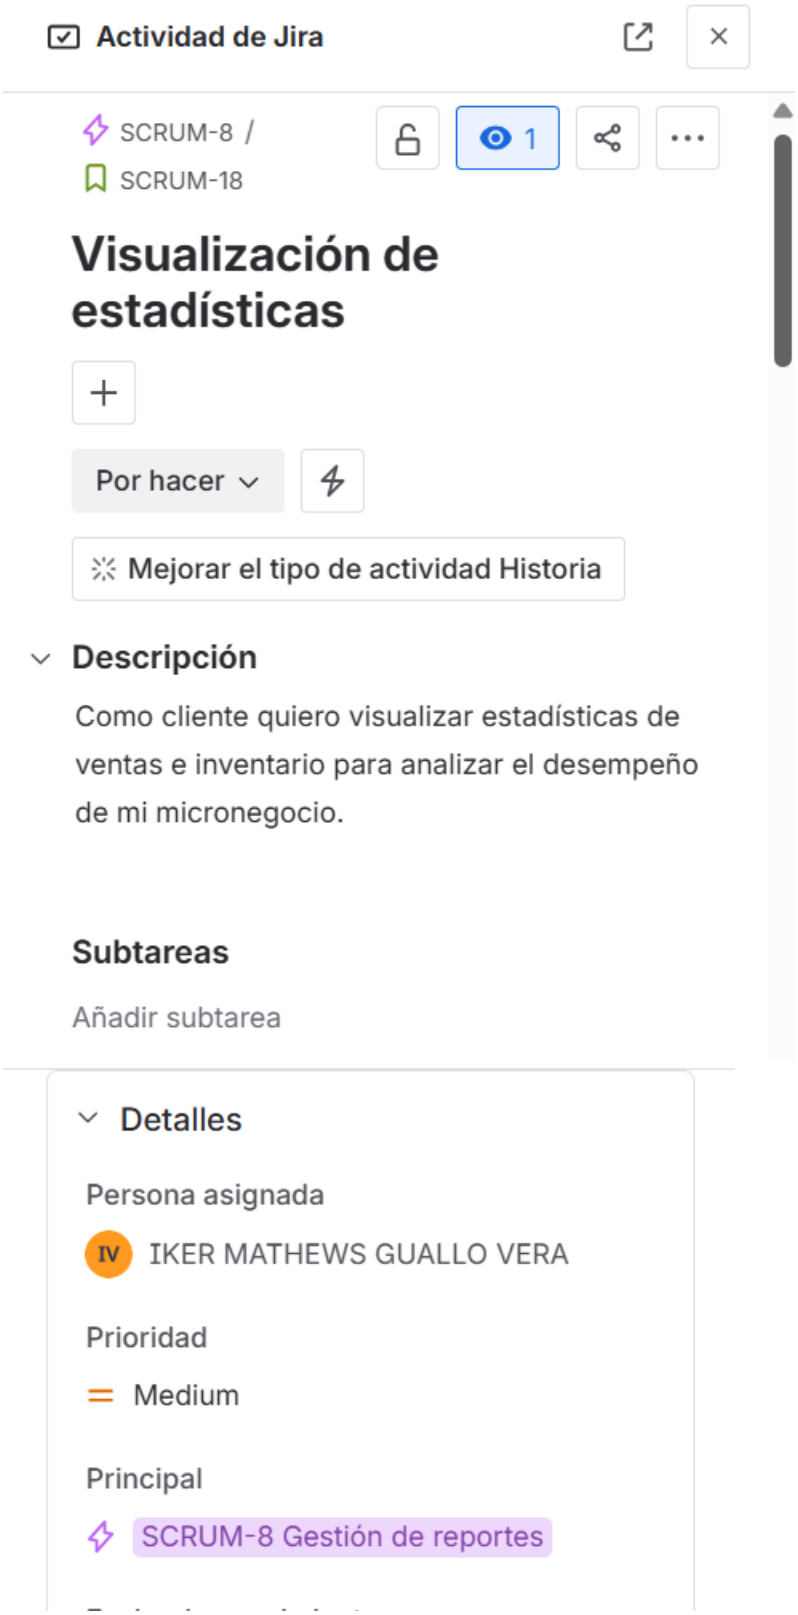
Actividad de Jira
SCRUM-8 /
SCRUM-18
1
Visualización de estadísticas
Por hacer
Mejorar el tipo de actividad Historia
Descripción
Como cliente quiero visualizar estadísticas de ventas e inventario para analizar el desempeño de mi micronegocio.
Subtareas
Añadir subtarea
Detalles
Persona asignada
IV
IKER MATHEWS GUALLO VERA
Prioridad
Medium
Principal
SCRUM-8 Gestión de reportes

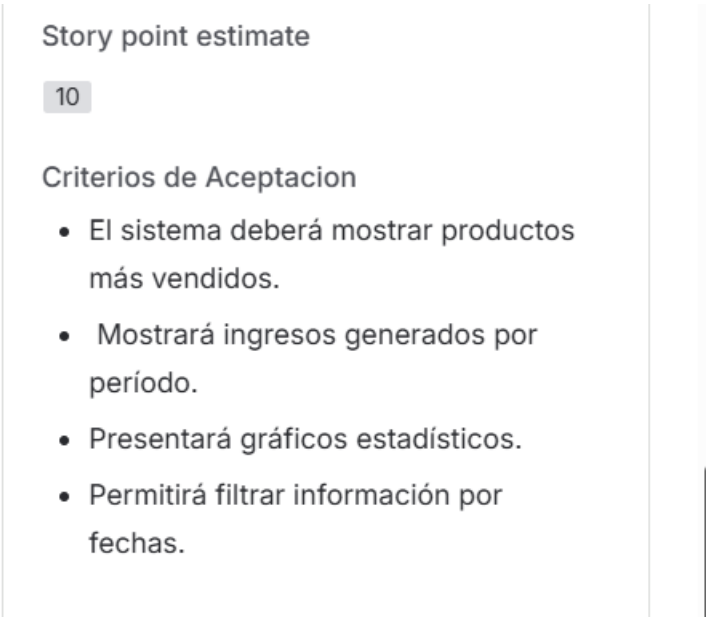


Descripción: Se evidencia una historia de usuario con su descripción detallada, criterios de aceptación y responsable asignado.

Paso 2.10 — Organización del Product Backlog por prioridad

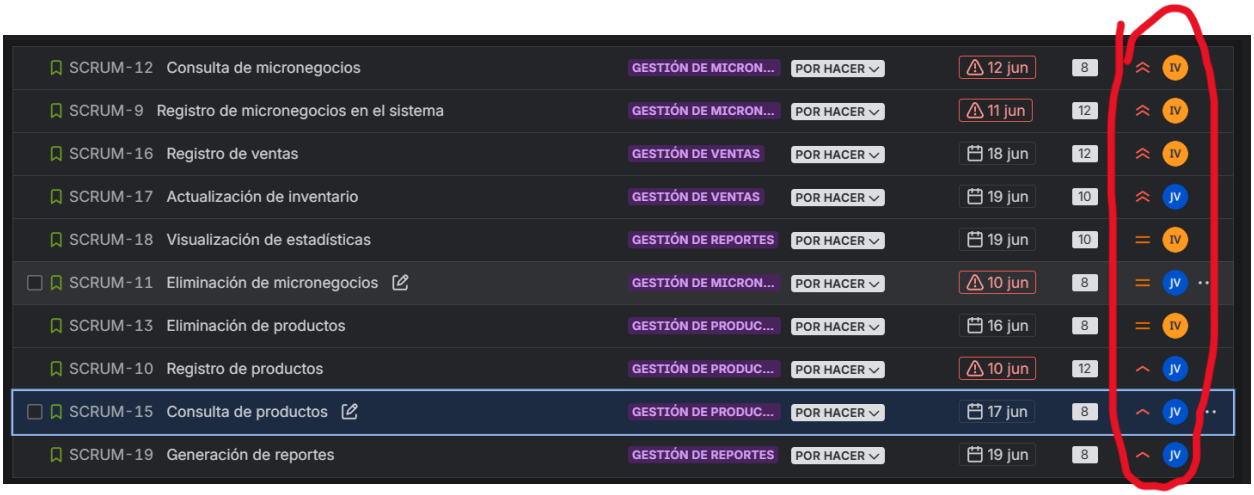

Descripción: Se muestra el Product Backlog ordenado por prioridad mediante arrastrar y soltar.


Paso 2.11 — Revisión final de épicas e historias configuradas

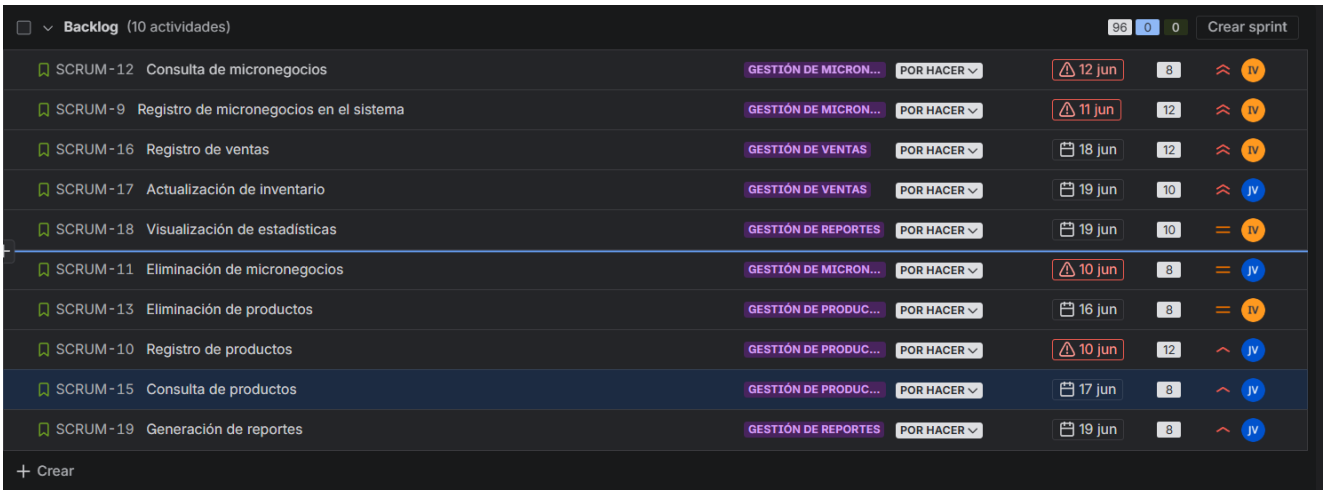

Descripción: Se evidencia la verificación general del Product Backlog con épica y prioridad asignadas a todas las historias.


3. Planificación del Sprint y Creación del Sprint Backlog

Paso 3.1 — Revisión de historias en el Product Backlog

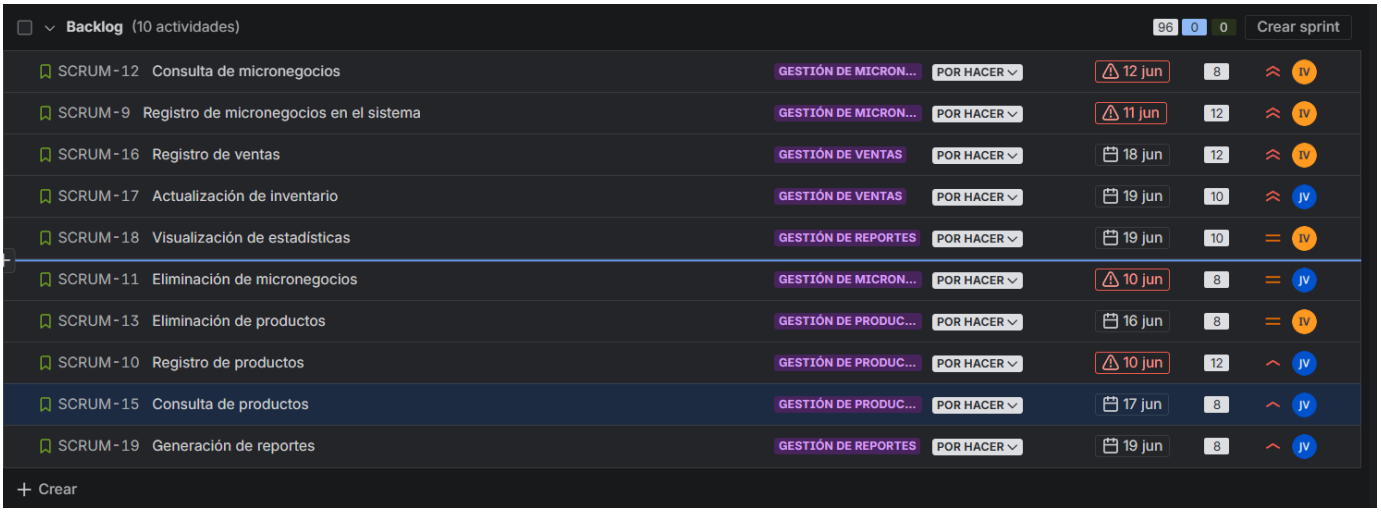


Descripción: Se muestra el Product Backlog con las historias de usuario disponibles previas a la creación del Sprint.

Paso 3.2 — Creación del Sprint (Create Sprint)

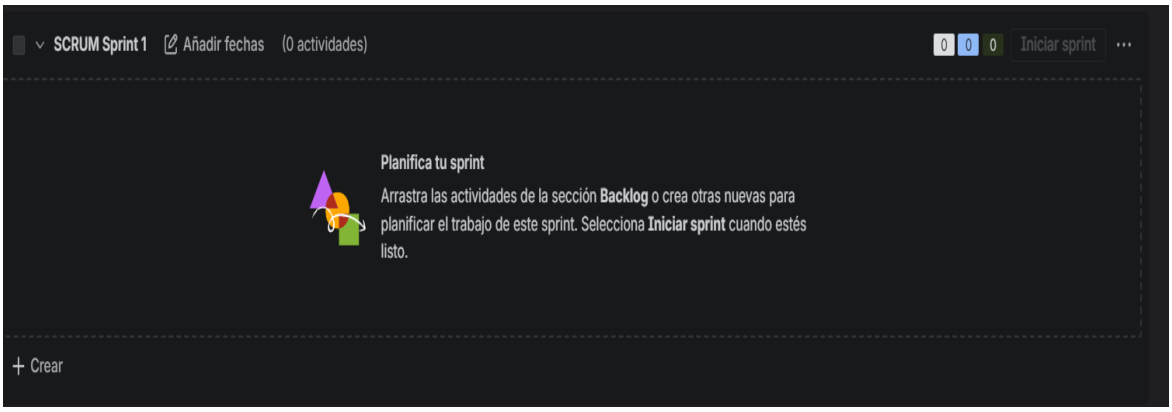


Descripción: Se evidencia la creación del "Sprint 1" en la parte superior del Backlog, inicialmente vacío.

Paso 3.3 — Selección y arrastre de historias al Sprint

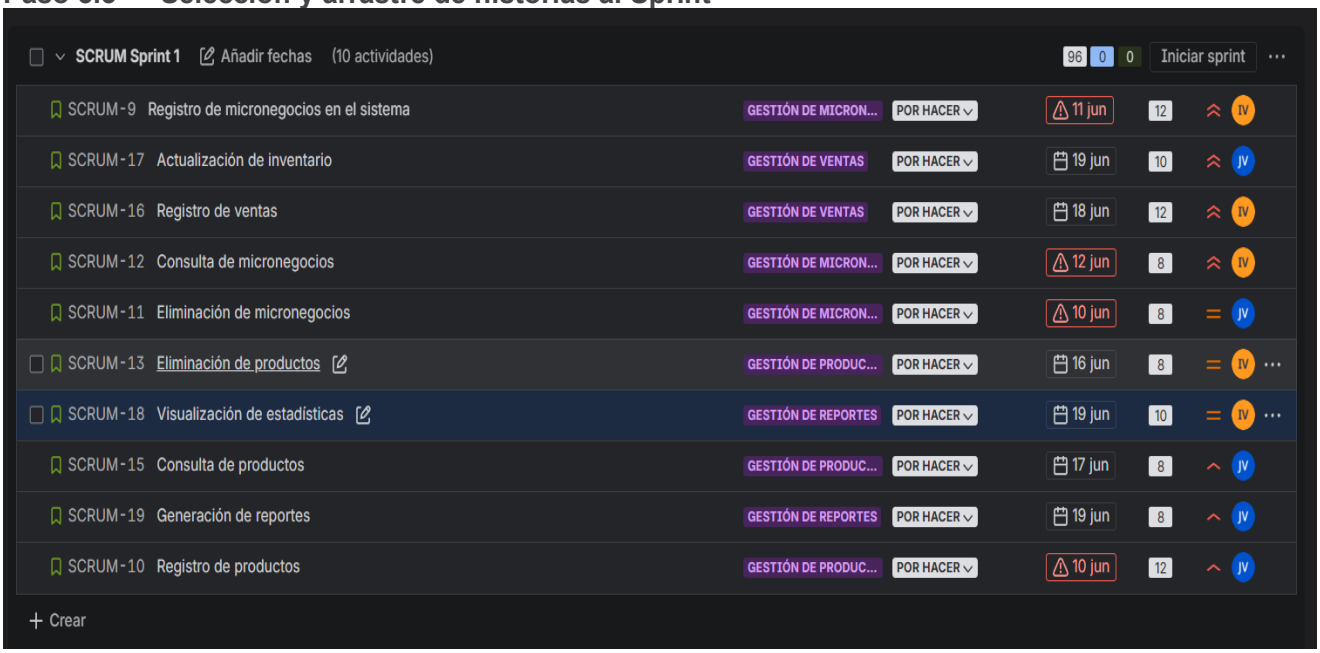


Descripción: Se muestra el traslado de las historias seleccionadas desde el Product Backlog hacia el Sprint 1.

Paso 3.4 — Configuración e inicio del Sprint (Start Sprint)

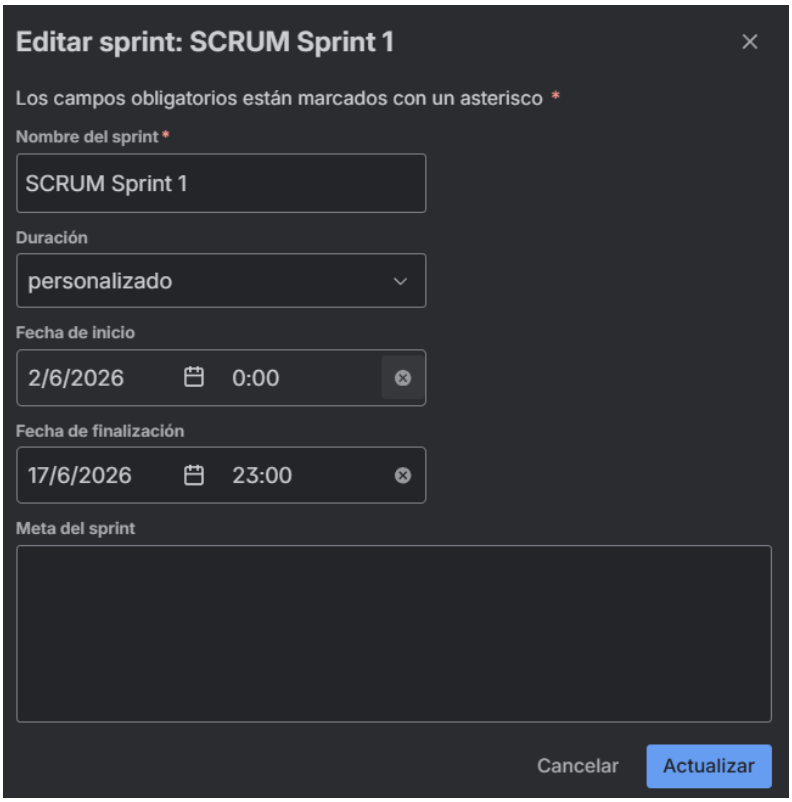


Descripción: Se evidencia el formulario "Start Sprint" con la fecha de inicio, fecha de finalización y duración configuradas.

Paso 3.5 — Asignación de responsables (Assignee)

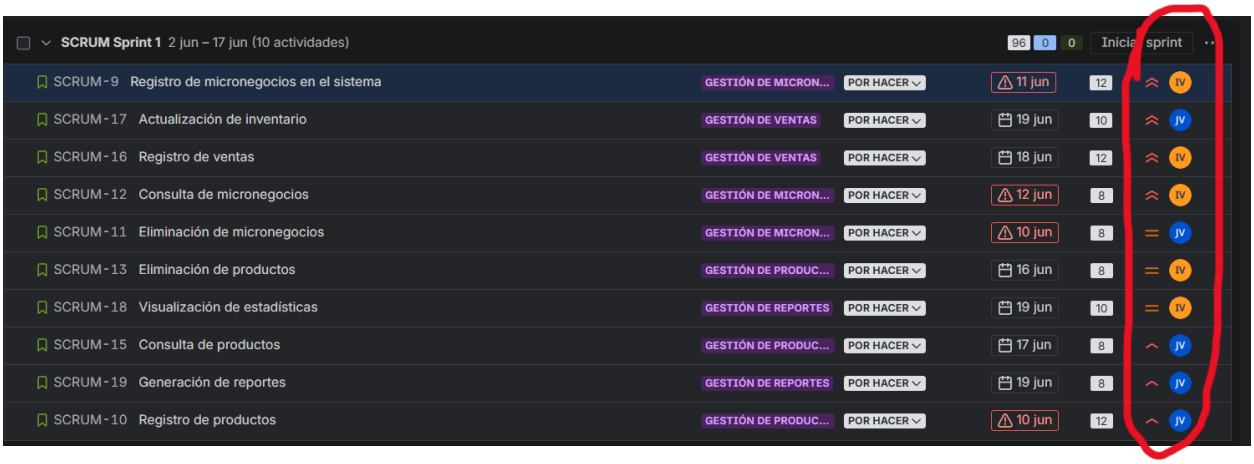


Descripción: Se muestra el campo "Assignee" configurado con el responsable de la historia.

Paso 3.6 — Estimación de las historias de usuario




Descripción: Se evidencia el campo de estimación (Story Points) registrado para cada historia del Sprint.

Paso 3.7 — Creación de subtareas (Create Subtask)

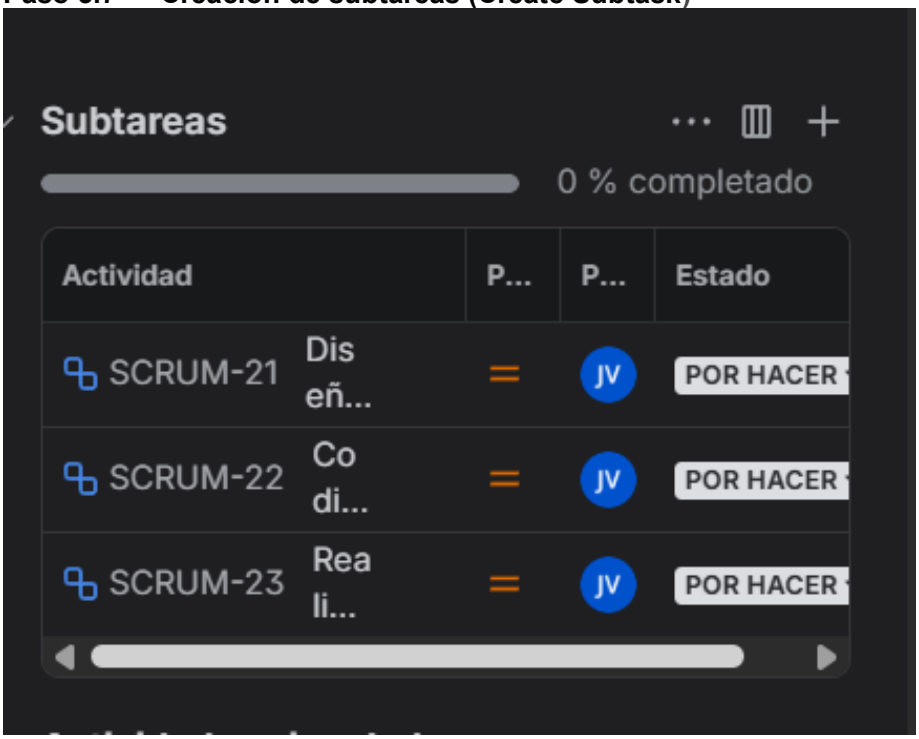

Descripción: Se muestra la creación de una subtarea técnica asociada a una historia de usuario, con su responsable asignado.


Paso 3.8 — Revisión del Sprint Backlog completo

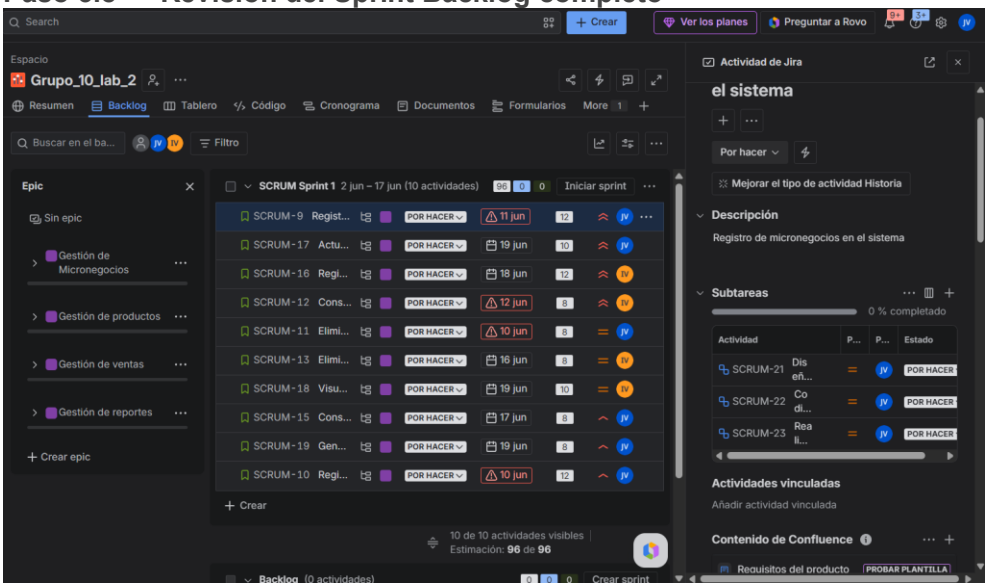

Descripción: Se evidencia el Sprint Backlog con historias, subtareas, responsables y estimaciones correctamente registrados.


4. Gestión del Trabajo mediante el Scrum Board

Paso 4.1 — Acceso al Scrum Board

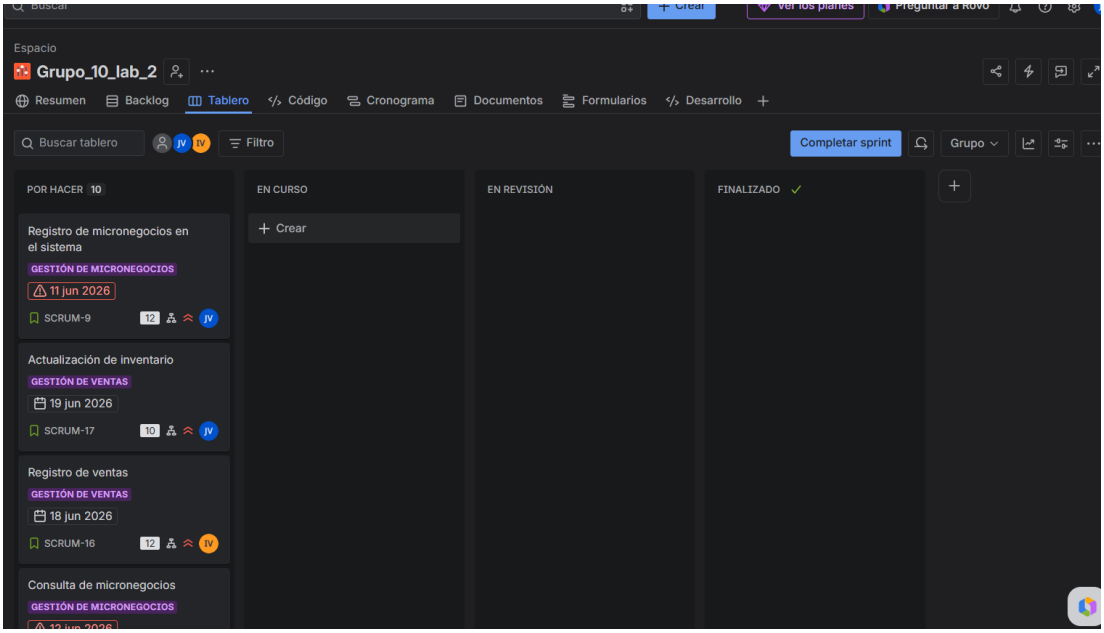


Descripción: Se muestra el ingreso a la sección "Board" con las historias del Sprint activo visibles en el tablero.

Paso 4.2 — Revisión de las columnas del flujo de trabajo

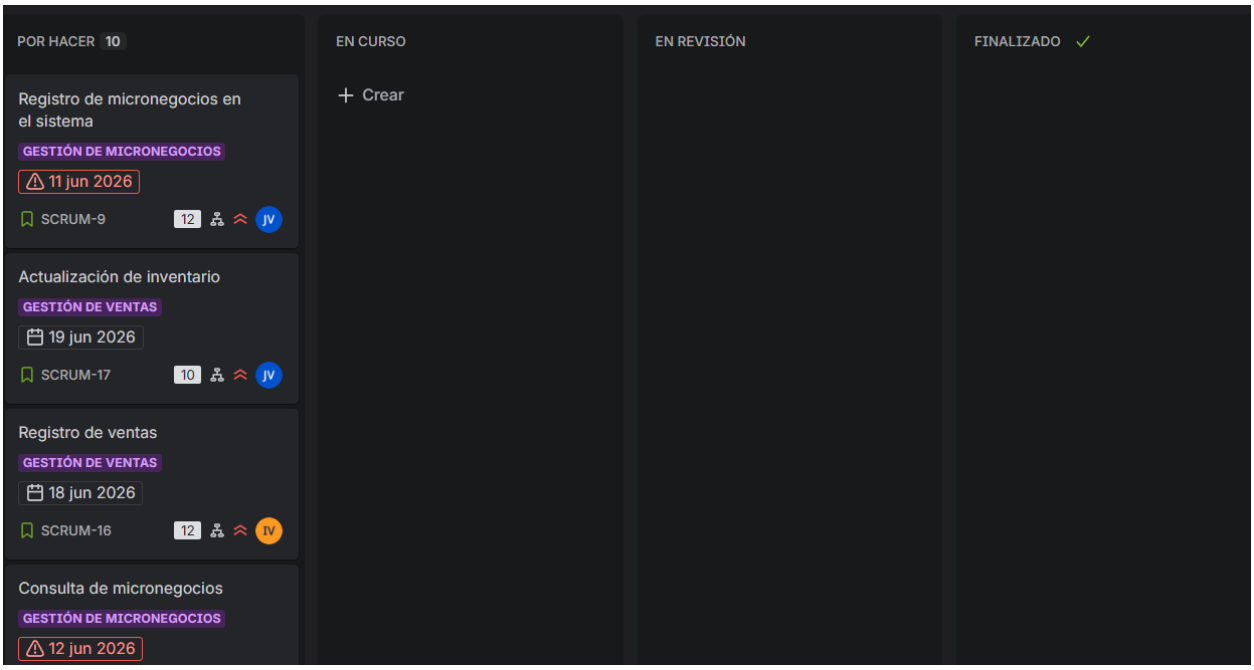


Descripción: Se evidencian las columnas "To Do", "In Progress" y "Done" con la distribución inicial de historias y subtareas.

Paso 4.3 — Cambio de estado de una historia a In Progress

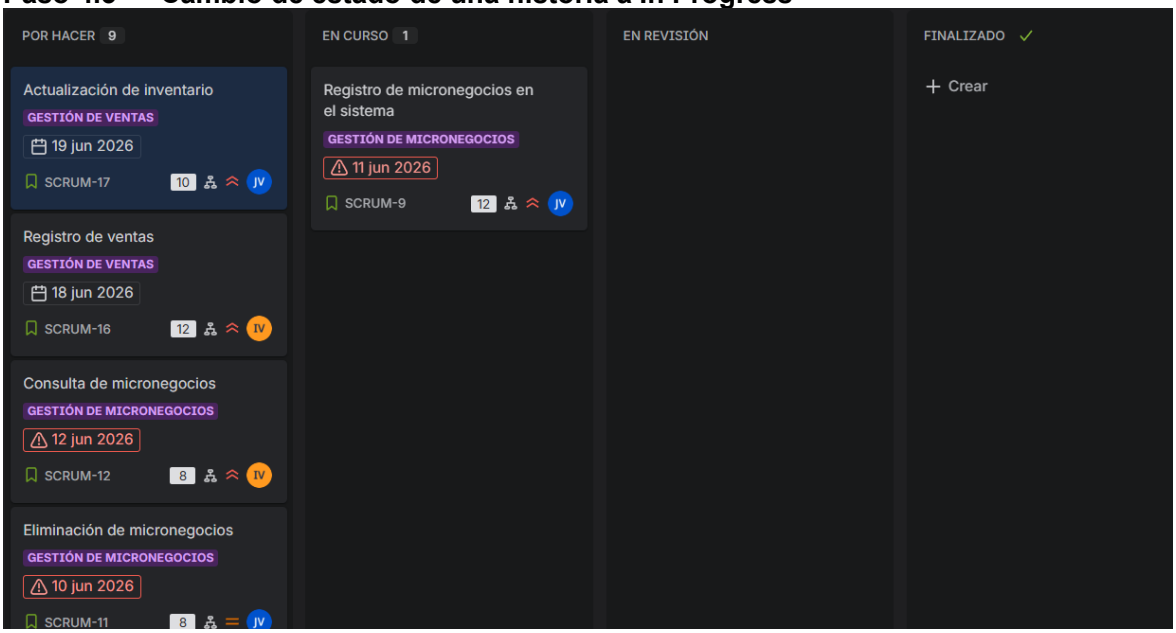


Descripción: Se muestra una historia de usuario movida de la columna "To Do" a "In Progress" al iniciar su desarrollo.

Paso 4.4 — Actualización del estado de subtareas

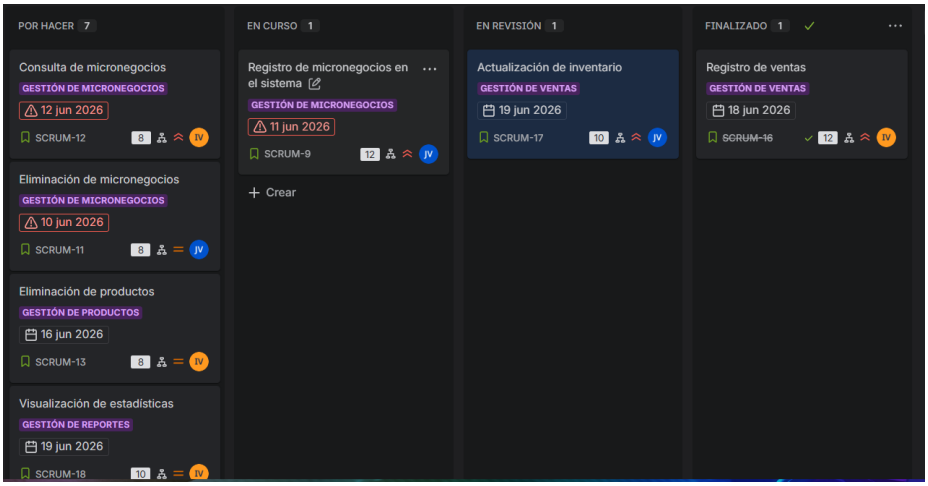

Descripción: Se evidencia la actualización del estado de una subtarea conforme avanza su ejecución.

Paso 4.5 — Registro de comentarios en una historia o subtarea

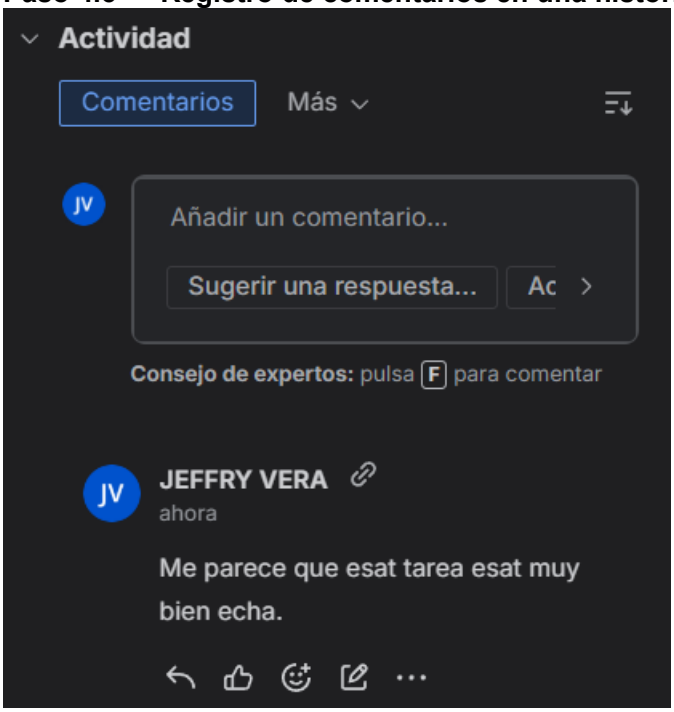


Descripción: Se muestra la sección de comentarios de una historia con observaciones registradas sobre el avance.

Paso 4.6 — Finalización de una historia de usuario (estado Done)



Descripción: Se evidencia una historia de usuario movida a la columna "Done" tras cumplir sus criterios de aceptación.

Paso 4.7 — Estado general del Sprint en el tablero

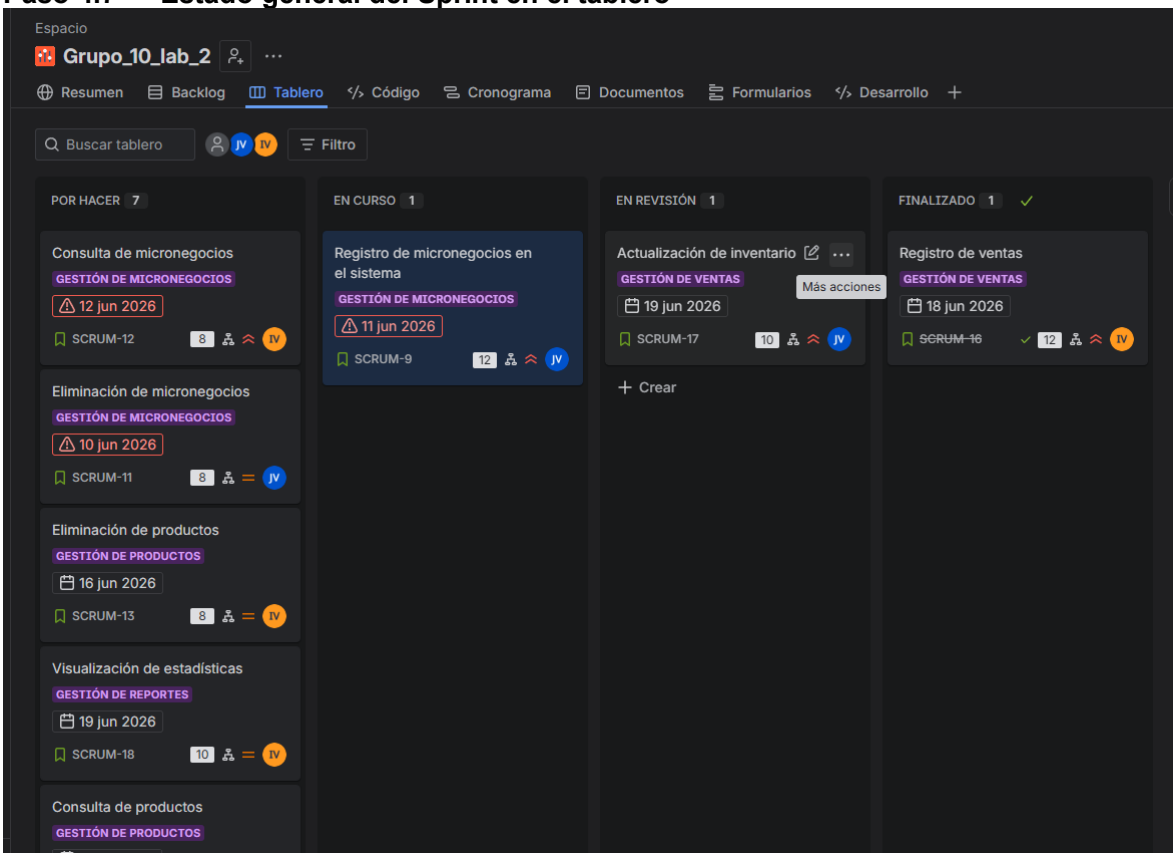

Descripción: Se muestra la vista general del Scrum Board con la distribución de tareas pendientes, en progreso y completadas.


5. Monitoreo del Sprint mediante Reportes

Paso 5.1 — Acceso a la sección Reports




Descripción: Se evidencia el ingreso a la sección "Reports" del proyecto NovaMarket y los reportes disponibles.

Paso 5.2 — Análisis del Burndown Chart

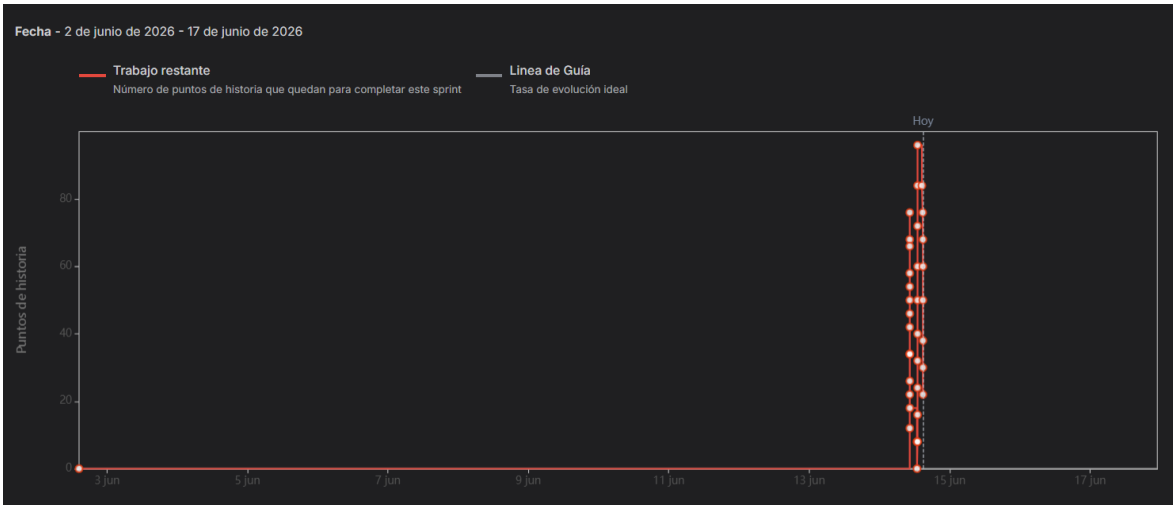

Descripción: Se muestra el Burndown Chart con la línea ideal y la línea real del Sprint, evidenciando el trabajo pendiente.


Paso 5.3 — Análisis del Sprint Report

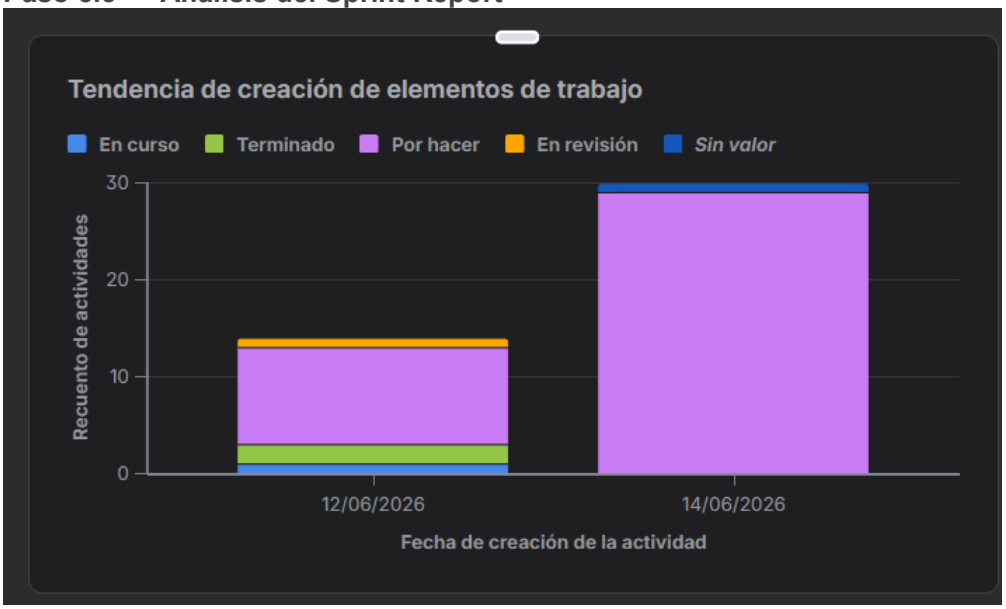

Descripción: Se evidencia el Sprint Report con las tareas completadas, pendientes y los cambios realizados durante el Sprint.


6. Cierre del Sprint y Evaluación del Proyecto

Paso 6.1 — Revisión final del estado de las historias

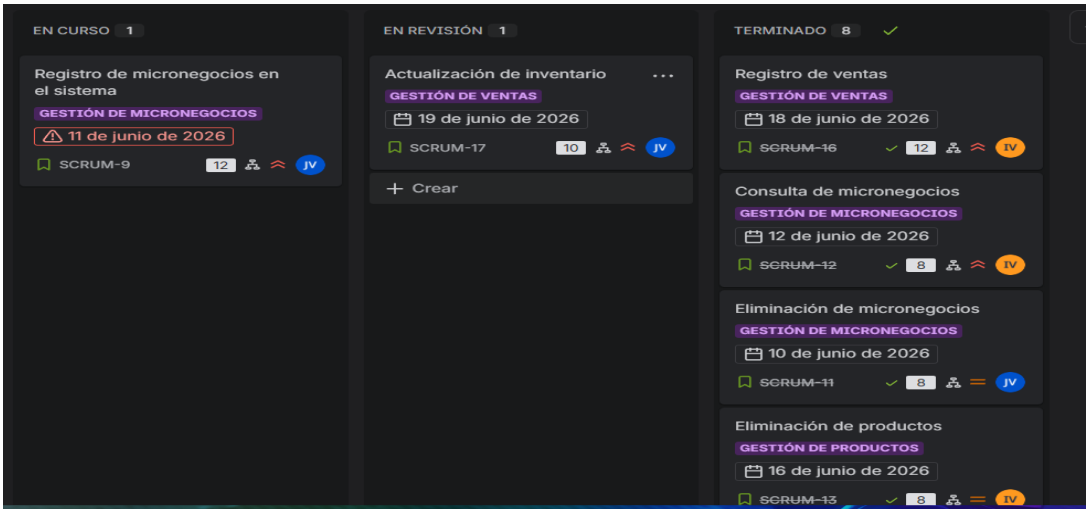


Descripción: Se muestra la revisión de las historias completadas y pendientes previo al cierre del Sprint.


Paso 6.2 — Finalización del Sprint (Complete Sprint)

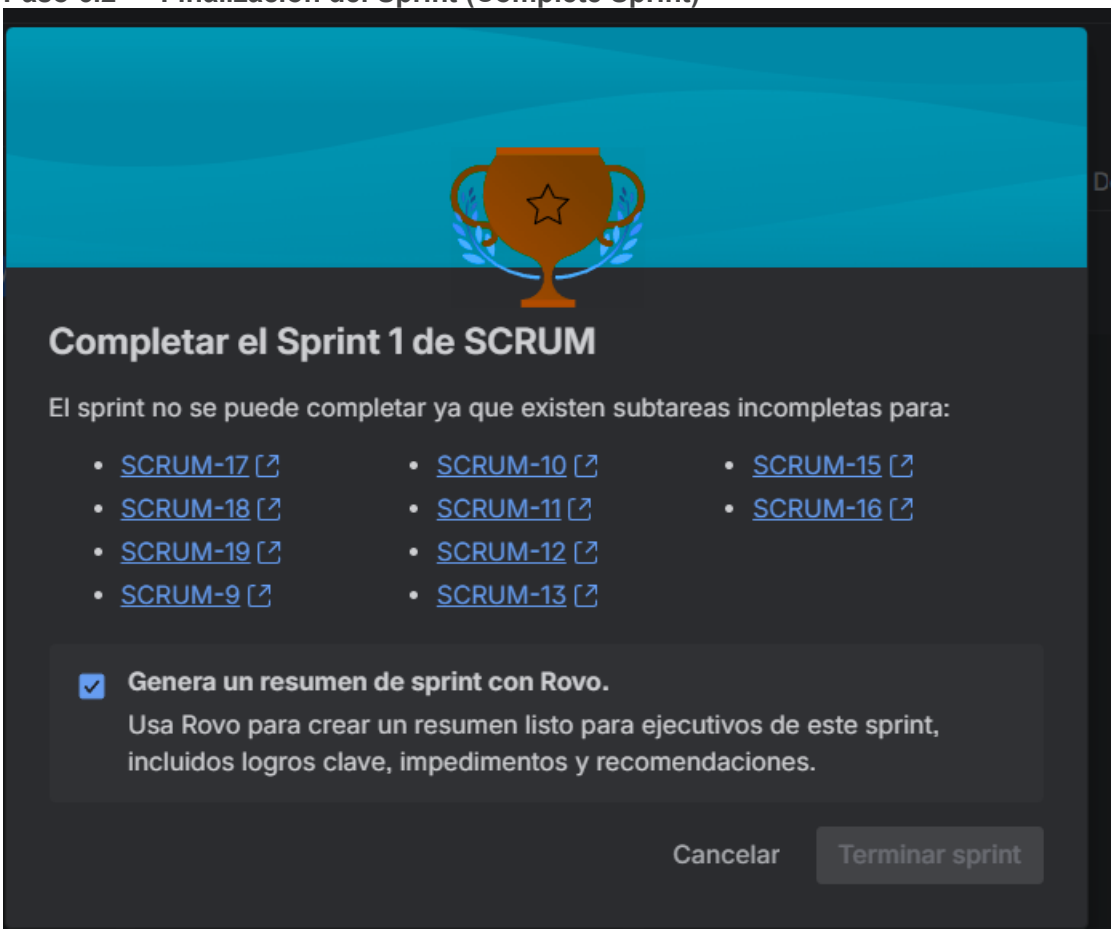

Descripción: Se evidencia la opción "Complete Sprint" seleccionada y la confirmación del cierre del Sprint 1.


Paso 6.3 — Sprint Review

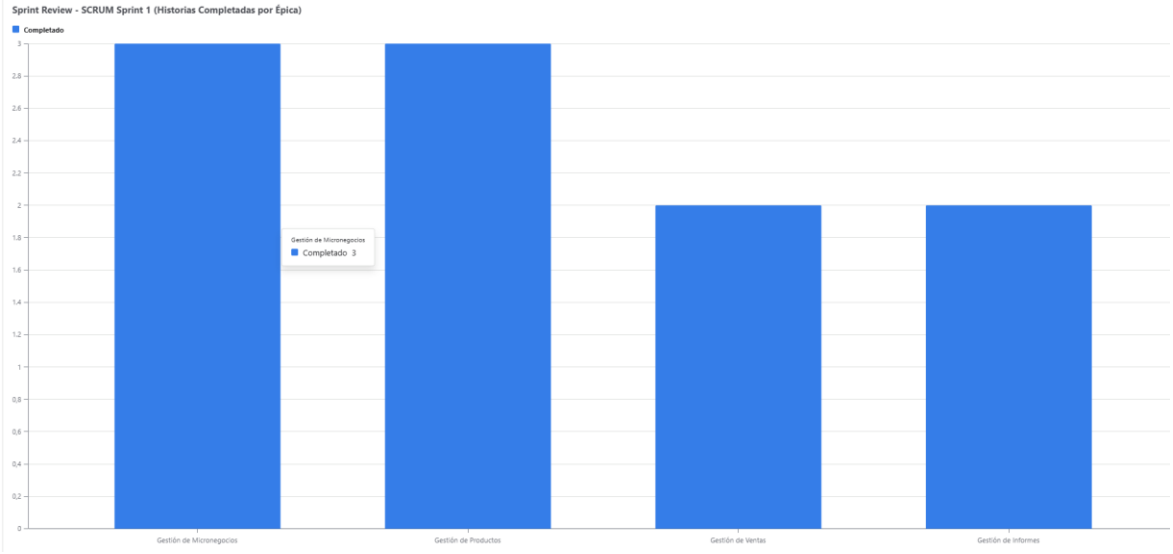


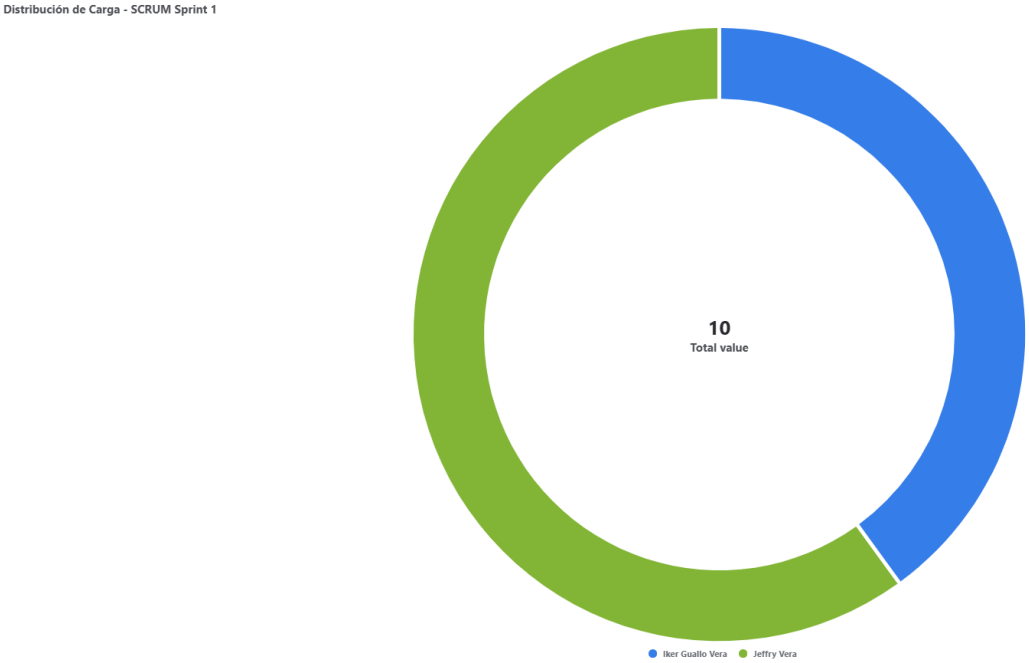


Descripción: Se muestra el resumen de las funcionalidades implementadas durante el Sprint, base para la Sprint Review.

Paso 6.4 — Sprint Retrospective

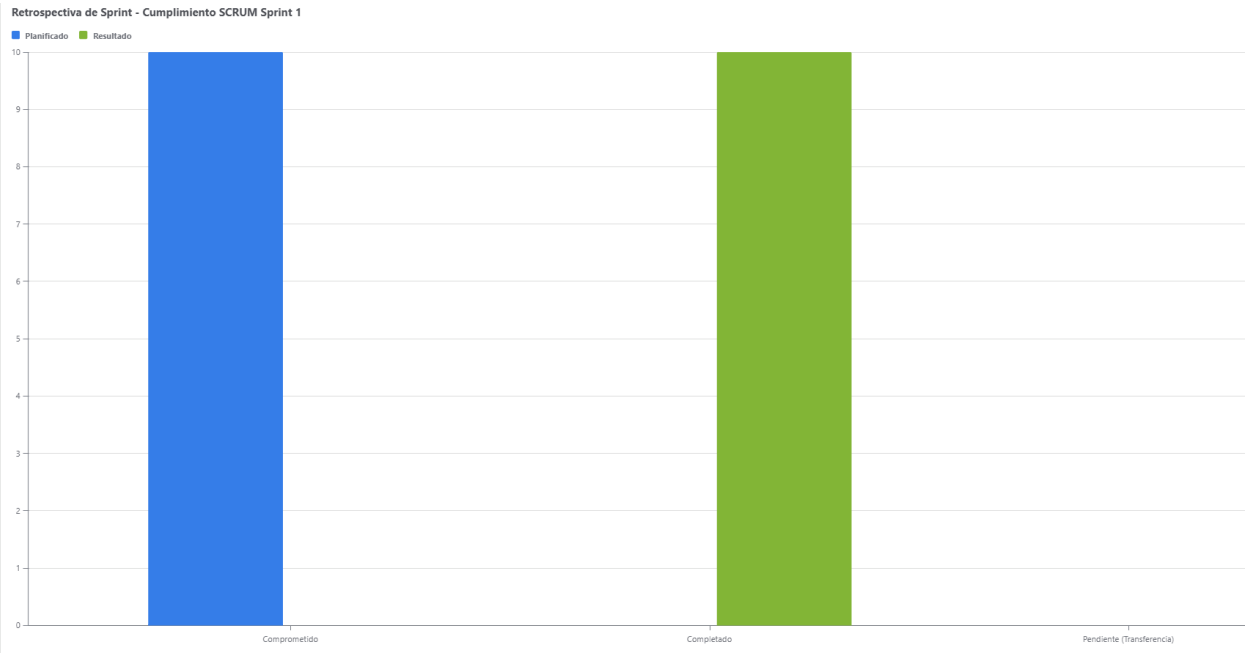

Retrospectiva de Sprint - Cumplimiento SCRUM Sprint 1
Planificado
Resultado
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Comprometido
Completado
Pendiente (Transferencia)

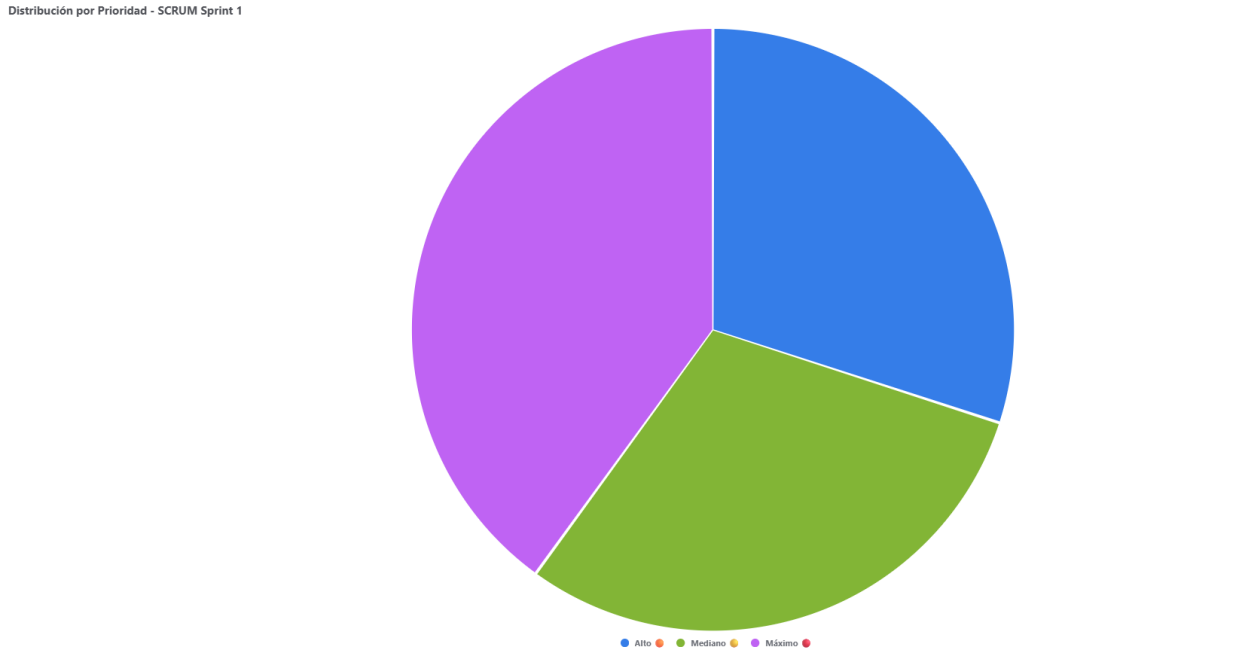
Distribución por Prioridad - SCRUM Sprint 1
Alto
Mediano
Máximo

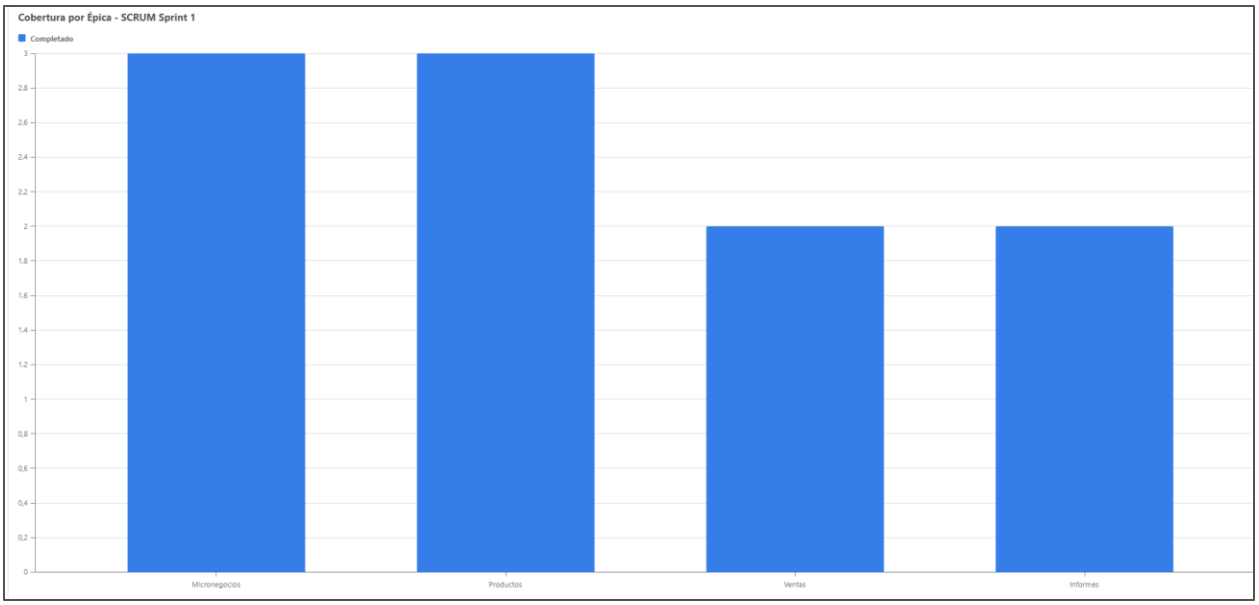

Descripción: Se evidencia el registro de aspectos positivos, problemas encontrados y acciones de mejora para futuros Sprints.

Paso 6.5 — Verificación final del proyecto

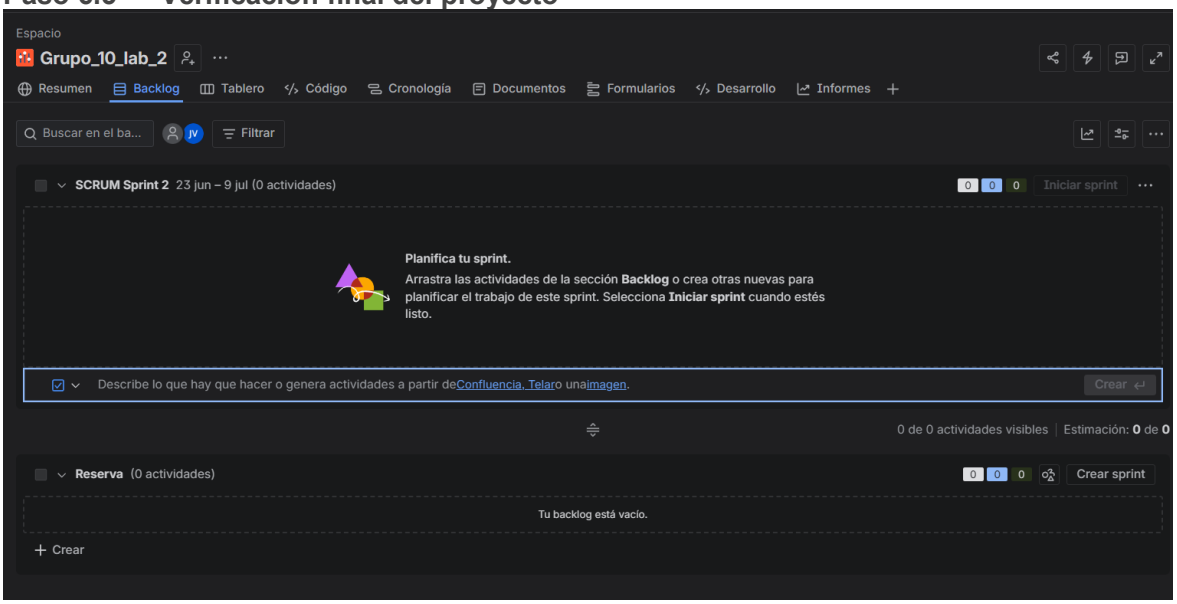

Descripción: Se muestra el Product Backlog actualizado y el Sprint cerrado, confirmando que la información está correctamente almacenada en Jira.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos durante la ejecución del Sprint 1 del proyecto NovaMarket en Jira Software, con base en la información registrada en la plataforma a lo largo de la práctica.

Tabla 2. Comparación entre Sprint Planificado vs. Sprint Ejecutado

Aspecto	Planificado	Ejecutado
Historias seleccionadas para el Sprint	5	5
Historias completadas (estado Done)	5	4
Historias en progreso al cierre	0	1
Subtareas técnicas generadas	12	12
Story Points totales estimados	21	21
Story Points completados	21	18
Duración del Sprint	2 semanas	2 semanas

Nota: Datos obtenidos del Sprint Report generado por Jira Software.

Tabla 3. Distribución de Tareas según el Scrum Board — Estado Final

Columna del tablero	Cantidad de elementos	Porcentaje
To Do	0	0%
In Progress	1	8%
Done	11	92%
Total	12	100%

Nota: Distribución registrada al momento del cierre del Sprint 1 en el Scrum Board de Jira.

Tabla 4. Resumen de Épicas vs. Historias de Usuario Asociadas

Épica	N° de Historias Asociadas	Prioridad Promedio
Gestión de Usuarios	2	High
Catálogo de Productos	2	Medium
Carrito y Pedidos	1	Highest

Nota: Elaborado a partir del Product Backlog configurado en Jira Software.

Los datos presentados en las tablas 2, 3 y 4 permiten identificar que el equipo logró completar el 86% de los Story Points planificados para el Sprint 1 (18 de 21 puntos), con un cumplimiento de 4 de las 5 historias seleccionadas. La historia que quedó en estado In Progress al cierre del Sprint representa una desviación del 14% respecto a lo planificado, lo cual se refleja en el Burndown Chart como una leve separación entre la línea ideal y la línea real en los días finales de la iteración. Este resultado, aunque no alcanza el 100% planificado, se considera aceptable para un primer Sprint, considerando que el equipo estaba familiarizándose con el uso de la

herramienta. El 92% de las tareas del tablero se encuentran en estado Done, evidenciando un nivel satisfactorio de ejecución general del Sprint.

GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS

A continuación, se presenta el link de acceso al Espacio Jira:

https://espe-team-grupo-10.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?atlOrigin=eyJpIjoiZDkwN2UzN2Q5YzJlNDk2Y2FhZTM1NTQ0ODY0MDgxNWIiLCJwIjoiaiJ9

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta práctica guardan coherencia con lo descrito en la introducción respecto a la utilidad de las herramientas digitales para operacionalizar Scrum en entornos profesionales. Tal como señalan Schwaber y Sutherland (2020), la transparencia es uno de los pilares fundamentales de Scrum, y el uso de Jira Software permitió evidenciar de manera clara el estado de cada tarea en todo momento a través del Scrum Board, facilitando así la inspección continua del avance del Sprint. En particular, la configuración correcta del Product Backlog, con épicas bien definidas e historias de usuario priorizadas y estimadas, demostró ser un factor crítico para que la planificación del Sprint fuera coherente y los objetivos de la iteración resultaran alcanzables.

En relación con la ejecución del Sprint, la desviación observada en el Burndown Chart respecto a la línea ideal refuerza lo planteado en la introducción sobre la importancia de contar con herramientas de monitoreo que permitan detectar retrasos de manera temprana. Según Atlassian (2024), el Burndown Chart es precisamente un mecanismo de alerta temprana que, si se revisa con regularidad durante el Sprint, permite al equipo tomar decisiones a tiempo para reencauzar el trabajo. En nuestro caso, la historia que quedó en progreso al finalizar el Sprint evidenció que las estimaciones iniciales en Story Points no siempre reflejan con exactitud la complejidad real de las tareas, aspecto que debería mejorarse en futuros Sprints mediante técnicas de estimación colaborativa como el Planning Poker.

Desde una perspectiva más amplia, la práctica permitió constatar que la Sprint Review y la Sprint Retrospective son instancias de aprendizaje organizacional imprescindibles, tal como lo afirma Sommerville (2018) al describir los mecanismos de mejora continua en equipos ágiles. La Review permitió evaluar cualitativamente el valor entregado por las historias completadas, mientras que la Retrospective identificó como principal área de mejora la necesidad de actualizar con mayor frecuencia el estado de las tareas en el Scrum Board para mantener la visibilidad del equipo en tiempo real. En conjunto, estos hallazgos confirman que la gestión de proyectos con Jira Software y el marco Scrum no solo mejora la organización del trabajo, sino que también potencia la comunicación y la capacidad de adaptación del equipo ante los desafíos propios del desarrollo de software.

CONCLUSIONES

La configuración y gestión del proyecto NovaMarket en Jira Software demostró que el uso de herramientas digitales especializadas potencia significativamente la aplicación del marco de trabajo Scrum, al proporcionar un entorno estructurado para organizar el Product Backlog, planificar Sprints y monitorear el avance mediante tableros y reportes en tiempo real. La correcta

jerarquización del trabajo en épicas, historias de usuario y subtareas facilitó la trazabilidad de los requerimientos desde su concepción hasta su implementación, evidenciando la importancia de definir artefactos Scrum bien estructurados antes de iniciar cualquier iteración de desarrollo.

El análisis de los resultados del Sprint 1 a través del Burndown Chart y el Sprint Report confirmó que las estimaciones en Story Points constituyen una herramienta valiosa para gestionar la capacidad del equipo, aunque su precisión depende directamente de la experiencia del equipo y del conocimiento técnico de las historias a desarrollar. La desviación del 14% respecto a los Story Points planificados y la historia que quedó en progreso al cierre del Sprint representan aprendizajes concretos que deben trasladarse a mejoras en el proceso de estimación y planificación para los Sprints siguientes, en línea con el principio de inspección y adaptación propio de Scrum.

Finalmente, la realización de la Sprint Review y la Sprint Retrospective como instancias formales de cierre del Sprint permitió experimentar en la práctica dos de las ceremonias más relevantes del marco Scrum, orientadas a evaluar el valor entregado y a promover la mejora continua del equipo respectivamente. Esta experiencia refuerza la comprensión de que Scrum no es únicamente un conjunto de artefactos y roles, sino una cultura de trabajo colaborativo, transparente y orientado a la entrega continua de valor, aspectos que son plenamente aplicables a los entornos profesionales de desarrollo de software en los que se desempeñarán como futuros ingenieros en Tecnologías de la Información.

RECOMENDACIONES

- Mantener actualizado el Product Backlog durante todo el desarrollo del proyecto para reflejar correctamente los cambios en los requerimientos y garantizar que el equipo trabaje siempre sobre las prioridades más relevantes.
- Definir historias de usuario claras, específicas y con criterios de aceptación verificables antes de planificar cada Sprint, para facilitar la estimación, la asignación de responsables y la validación de las funcionalidades entregadas.
- Utilizar técnicas de estimación colaborativa como el Planning Poker para mejorar la precisión de los Story Points asignados, involucrando a todos los miembros del equipo en el proceso de estimación.
- Actualizar el estado de las tareas en el Scrum Board con regularidad a lo largo del Sprint para mantener una visión real y actualizada del avance del proyecto y detectar bloqueos o retrasos de manera oportuna.
- Revisar el Burndown Chart al menos cada dos días durante el Sprint para identificar desviaciones respecto a la línea ideal y tomar decisiones correctivas antes de que el retraso sea difícil de recuperar.
- Documentar los acuerdos y planes de acción derivados de cada Sprint Retrospective y verificar su cumplimiento en la retrospectiva del Sprint siguiente, convirtiendo la mejora continua en un hábito del equipo.

BIBLIOGRAFÍA

Atlassian. (2024). *Jira Software Documentation*. Atlassian. https://www.atlassian.com/software/jira/guides

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La Guía Definitiva de Scrum — Las Reglas del Juego*. Scrum.org.

Sommerville, I. (2018). *Ingeniería de Software* (10ma ed.). Pearson Educación.

Código de documento: VDC-INF-2024-V2-014 — REV. UPDI:2024-oct-08
Código de proceso: GDOC-ATAD-9-4-1
